

Pirehmedli kendi is qrafiki bl - Prog						
Activity ID	Activity Name	Original Duration	BL Project Start	BL Project Finish	Planned % Complete	Actual % Complete
Pirehmedli kendi is qrafiki bl - Prog		609	06-Aug-25	30-Oct-26	56.06%	49.64%
Milestones		609	06-Aug-25	30-Oct-26	56.06%	49.64%
Ilkin tarixler		0	06-Aug-25	06-Aug-25	0%	0%
MRH-1000	Sifarisçi ile müqavilenin imzalanmasi	0	06-Aug-25		100%	0%
MRH-1010	Mobilizasiya islerinin baslanmasi	0	06-Aug-25		100%	0%
Tikinti insaat tarihi		391	06-Aug-25	30-Oct-26	0%	0%
MRH-1020	Layihe icrasinin baslanmasi	0	01-Nov-25		100%	0%
MRH-1025	Materialların sifarıs verilmesi	0		07-Dec-25	100%	0%
MRH-1030	FYE-Torpaq islerinin bitmesi	0		20-Dec-25	100%	0%
MRH-1040	Tıbb Menteşesi	0		21-Oct-26	0%	0%
MRH-1050	FYE-Demir-beton islerinin bitmesi	0		21-May-26	100%	0%
MRH-1060	FYE-Dam islerinin bitmesi	0		17-Jun-26	0%	0%
MRH-1070	Bagca Binası	0		18-Sep-26	0%	0%
MRH-1080	FYE-Isitme, ventilyasiya islerinin bitmesi	0		23-Oct-26	0%	0%
MRH-1090	FYE-Elektrik ve zeif axın islerin bitmesi	0		20-Sep-26	0%	0%
MRH-1100	FYE-Qaz techizatı islerinin bitmesi	0		17-Oct-26	0%	0%
MRH-1110	FYE-Su ve kanalizasiya islerin bitmesi	0		25-Oct-26	0%	0%
MRH-1120	FYE-Qapi ve pencere islerinin bitmesi	0		23-Oct-26	0%	0%
MRH-1130	FYE-Daxili bezek islerinin bitmesi	0		12-Sep-26	0%	0%
MRH-1140	FYE-Xarici bezek islerinin bitmesi	0		30-Sep-26	0%	0%
MRH-1150	Mekteb Binası	0		23-Oct-26	0%	0%
MRH-1160	Xarici Elektrik xettinin cekilmesi (Xarici Kom. Podratcisi terefinden)	0		06-Aug-25	100%	0%
MRH-1170	Xarici Su xettinin cekilmesi (Xarici Kom. Podratcisi terefinden)	0		06-Aug-25	100%	0%
MRH-1180	Xarici Qaz xettinin cekilmesi (Xarici Kom. Podratcisi terefinden)	0		06-Aug-25	100%	0%
MRH-1190	FYE-Abadlasdırma ve hasar islerinin bitmesi	0		08-Oct-26	0%	0%
MRH-1200	FYE-Horgu ve suvaq islerinin bitmesi	0		06-Aug-25	100%	0%
MRH-1210	FYE-Saygacdarın qurasdirılması	0		07-Oct-26	0%	0%
MRH-1220	Layihenin bitmesi	0		30-Oct-26	0%	0%
Alqi-satqi ve logistika		327	08-Dec-25	14-Oct-26	58.26%	57.58%
LOG-SOT-	Elektrik kabel ve boruların sifarısı ve saheyə catdirılması	236	08-Dec-25	04-Aug-26	76.69%	76.69%
LOG-SOT-	PVC boruların sifarısı və saheyə catdirılması	122	19-Jan-26	20-May-26	100%	100%
LOG-SOT-	FYE - PVC və MDF qapı , pencerelerin sifarısı və saheyə catdirılın	243	11-Jan-26	10-Sep-26	62.14%	62.14%
LOG-SOT-	FYE - Elektrik avadanlıqların sifarısı və saheyə catdirılması	200	22-Feb-26	09-Sep-26	54.5%	54.5%
LOG-SOT-	FYE - Santexnika avadanlıqların sifarısı və saheyə catdirılması	200	20-Feb-26	07-Sep-26	55.5%	55.5%
LOG-SOT-	FYE - Aqlayın sifarısı və saheyə catdirılması	200	10-Feb-26	28-Aug-26	60.5%	60.5%
LOG-SOT-	FYE - Kombi və radiatorların sifarısı və saheyə catdirılması	57	19-Aug-26	14-Oct-26	0%	0%
LOG-SOT-	FYE - Mebellerin sifarısı və saheyə catdirılması	220	15-Feb-26	22-Sep-26	52.73%	52.73%
LOG-SOT-	FYE - Saygacdarın sifarısı və saheyə catdirılması	25	06-Sep-26	30-Sep-26	0%	0%
LOG-SOT-	Mekteb mebel və avadanlıqların sifarısı və saheyə catdirılması	30	28-Jul-26	26-Aug-26	0%	0%
LOG-SOT-	Mekteb və Bagca ucun kondisionerlerin sifarısı və saheyə catdirılın	117	05-Apr-26	30-Jul-26	57.26%	47.86%
LOG-SOT-	Qazanxana ucun avadanlıqların sifarısı və saheyə catdirılması	220	19-Jan-26	26-Aug-26	65%	60%
LOG-SOT-	Nasosxana ucun avadanlıqların sifarısı və saheyə catdirılması	20	19-Aug-26	07-Sep-26	0%	0%
LOG-SOT-	Dizel generatorun sifarısı və saheyə catdirılması	20	03-Sep-26	22-Sep-26	0%	0%
Mobilizasiya Isleri		380	01-Nov-25	30-Oct-26	56.7%	56.7%
MOB-1270	Mobilizasiya	55	01-Nov-25	25-Dec-25	100%	100%
MOB-1280	Demobilizasiya	21	10-Oct-26	30-Oct-26	0%	0%
Musahide ve time laps		50	16-Nov-25	09-Jan-26	100%	100%
MTL-1290	Musahide kamera sisteminin kurulması	50	16-Nov-25	08-Jan-26	100%	100%
MTL-1300	Erazinin time laps ucun musahide edilmesi	0	09-Jan-26	09-Jan-26	100%	100%
Qeyri-Yasayı Binaları		574	01-Nov-25	23-Oct-26	40.32%	37.96%

Remaining Level of Effort

Primary Baseline

Remaining Work

Actual Level of Effort

Actual Work

Critical Remaining ...

Page 1 of 24

Date


Revision

Checked


Approved


19-May-21


R00

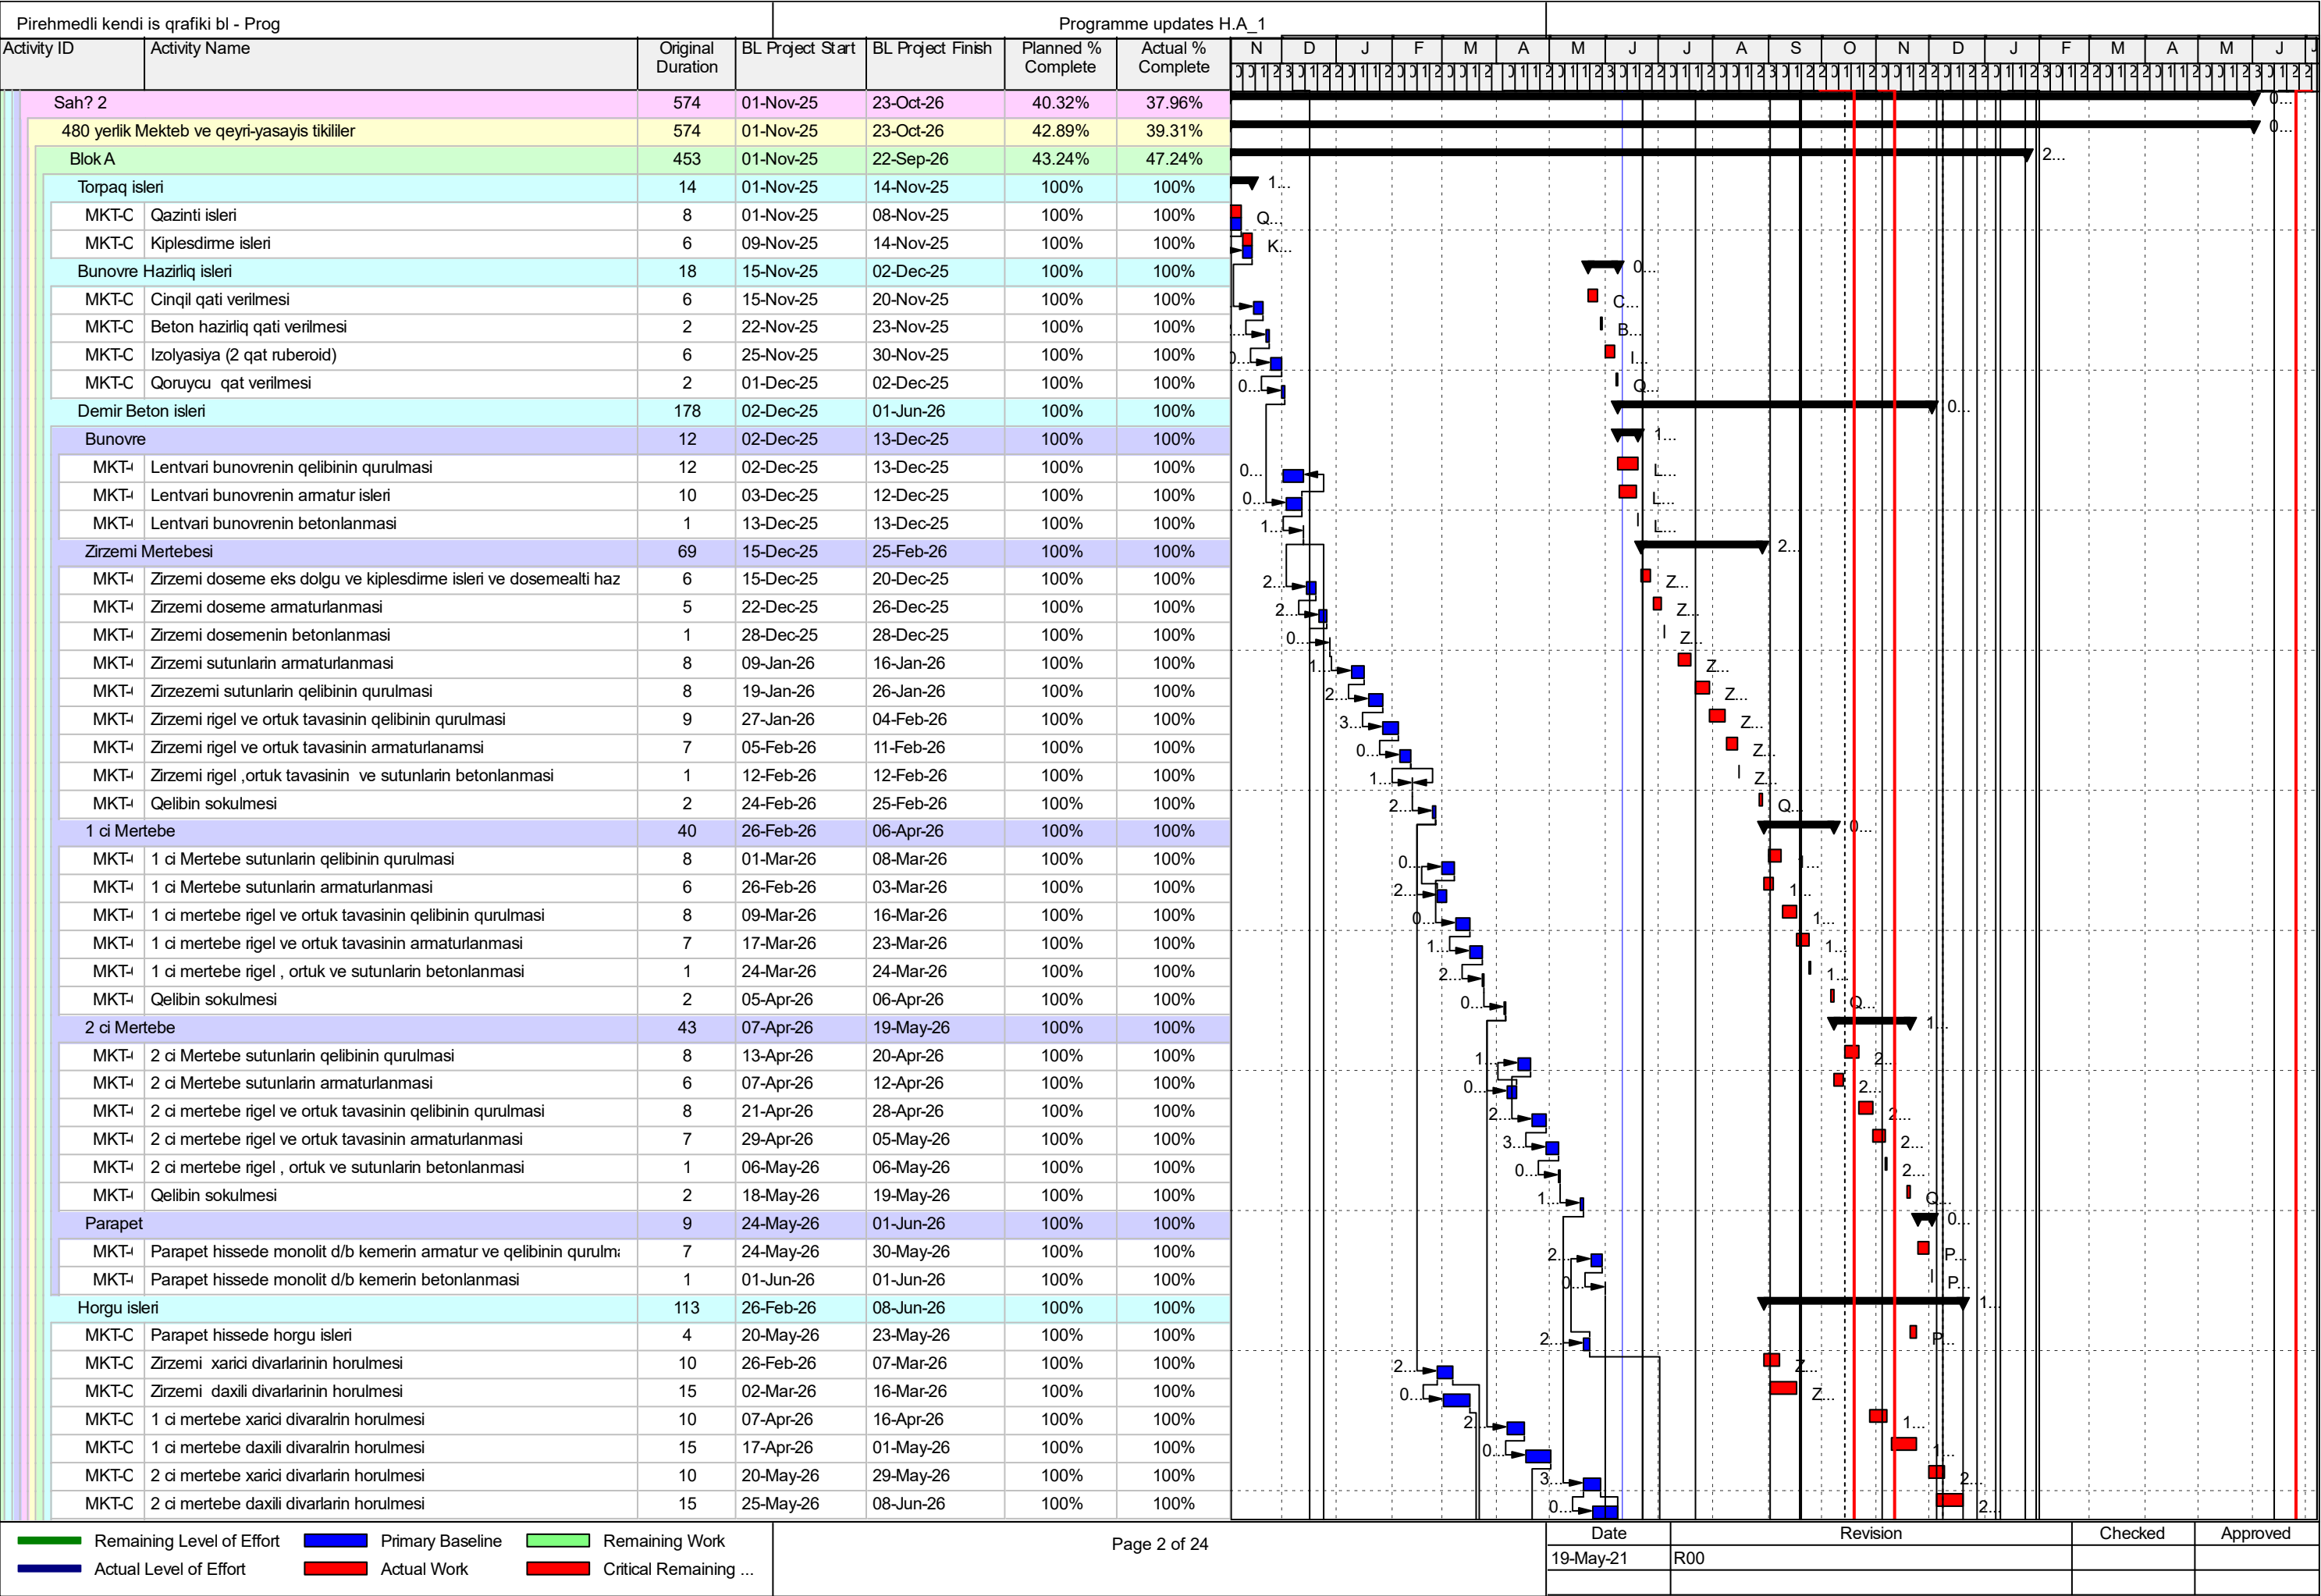



Pirehmedli kendi is grafiki bl - Prog			Programme updates H.A_1																															
Activity ID	Activity Name	Original Duration	BL Project Start	BL Project Finish	Planned % Complete	Actual % Complete	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J							
	Dam isleri	82	12-Jun-26	16-Aug-26	0%	88.24%																												
MKT-C	Dam ortuyun izolyasiyasi(das yunu ,sement qum nehlulu, 3 qat iz	25	12-Jun-26	26-Jun-26	0%	90%																												
MKT-C	Metal borulardan su axidici sistemin qurulmasi	5	12-Aug-26	16-Aug-26	0%	0%																												
	MEP isleri	227	09-Dec-25	09-Sep-26	36.36%	18.05%																												
	Elektrik Isleri	207	09-Dec-25	02-Sep-26	80.73%	53.39%																												
MKT-I	Zirzemi mertebesi elektrik boru ve kabellerinin cekilmesi	10	01-Apr-26	10-Apr-26	100%	55%																												
MKT-I	1 ci mertebes elektrik boru ve kabellerinin cekilmesi	15	02-May-26	16-May-26	100%	85%																												
MKT-I	2 ci mertebes elektrik boru ve kabellerinin cekilmesi	15	25-May-26	08-Jun-26	100%	65%																												
MKT-I	Paylayici lovhelerin qurasdirilmesi	5	04-Jul-26	08-Jul-26	0%	0%																												
MKT-I	Elektrik aksesuarlarinin qurasdirilmesi	10	24-Aug-26	02-Sep-26	0%	0%																												
MKT-I	Torpaqlama isleri	5	09-Dec-25	13-Dec-25	100%	0%																												
	Su kemeri ve kanalizasiya	75	11-May-26	04-Sep-26	17.86%	20.89%																												
MKT-I	2 ci mertebe su techizati ve istilik sistemi boru kemerlerin cekilmesi	15	29-Jun-26	13-Jul-26	0%	25%																												
MKT-I	2 ci mertebe kanalizasiya boru kemerlerinin cekilmesi	10	29-Jul-26	07-Aug-26	0%	10%																												
MKT-I	Santexnika aksesuarlarinin qurasdirilmesi	8	21-Aug-26	28-Aug-26	0%	0%																												
MKT-I	Avadanliqlarin qurasdirilmesi	7	29-Aug-26	04-Sep-26	0%	0%																												
MKT-I	Zirzemi mertebesinde propilen borularla ana xetlerin cekilmesi (iz	10	11-May-26	20-May-26	100%	0%																												
MKT-I	1 ci mertebe su techizati ve istilik sistemi boru kemerlerin cekilmesi	15	16-Jun-26	30-Jun-26	0%	45%																												
MKT-I	1 ci mertebe kanalizasiya boru kemerlerinin cekilmesi	10	16-Jul-26	25-Jul-26	0%	20%																												
	Isitme ventilyasiya ve kondisioner sistemi	96	04-Apr-26	02-Sep-26	65.22%	14.02%																												
MKT-I	1 ci mertebe hava oturuclu xetlerin cekilmesi	10	07-May-26	16-May-26	100%	25%																												
MKT-I	Menfezlerin qoyulmasi	3	31-Aug-26	02-Sep-26	0%	0%																												
MKT-I	2 ci mertebe istilik sistemi boru kemerlerin cekilmesi	12	29-Jun-26	10-Jul-26	0%	0%																												
MKT-I	Radiatorlarin qoyulmasi	10	24-Aug-26	02-Sep-26	0%	0%																												
MKT-I	Kondisioner qurasdirilmesi	12	05-Jul-26	16-Jul-26	0%	0%																												

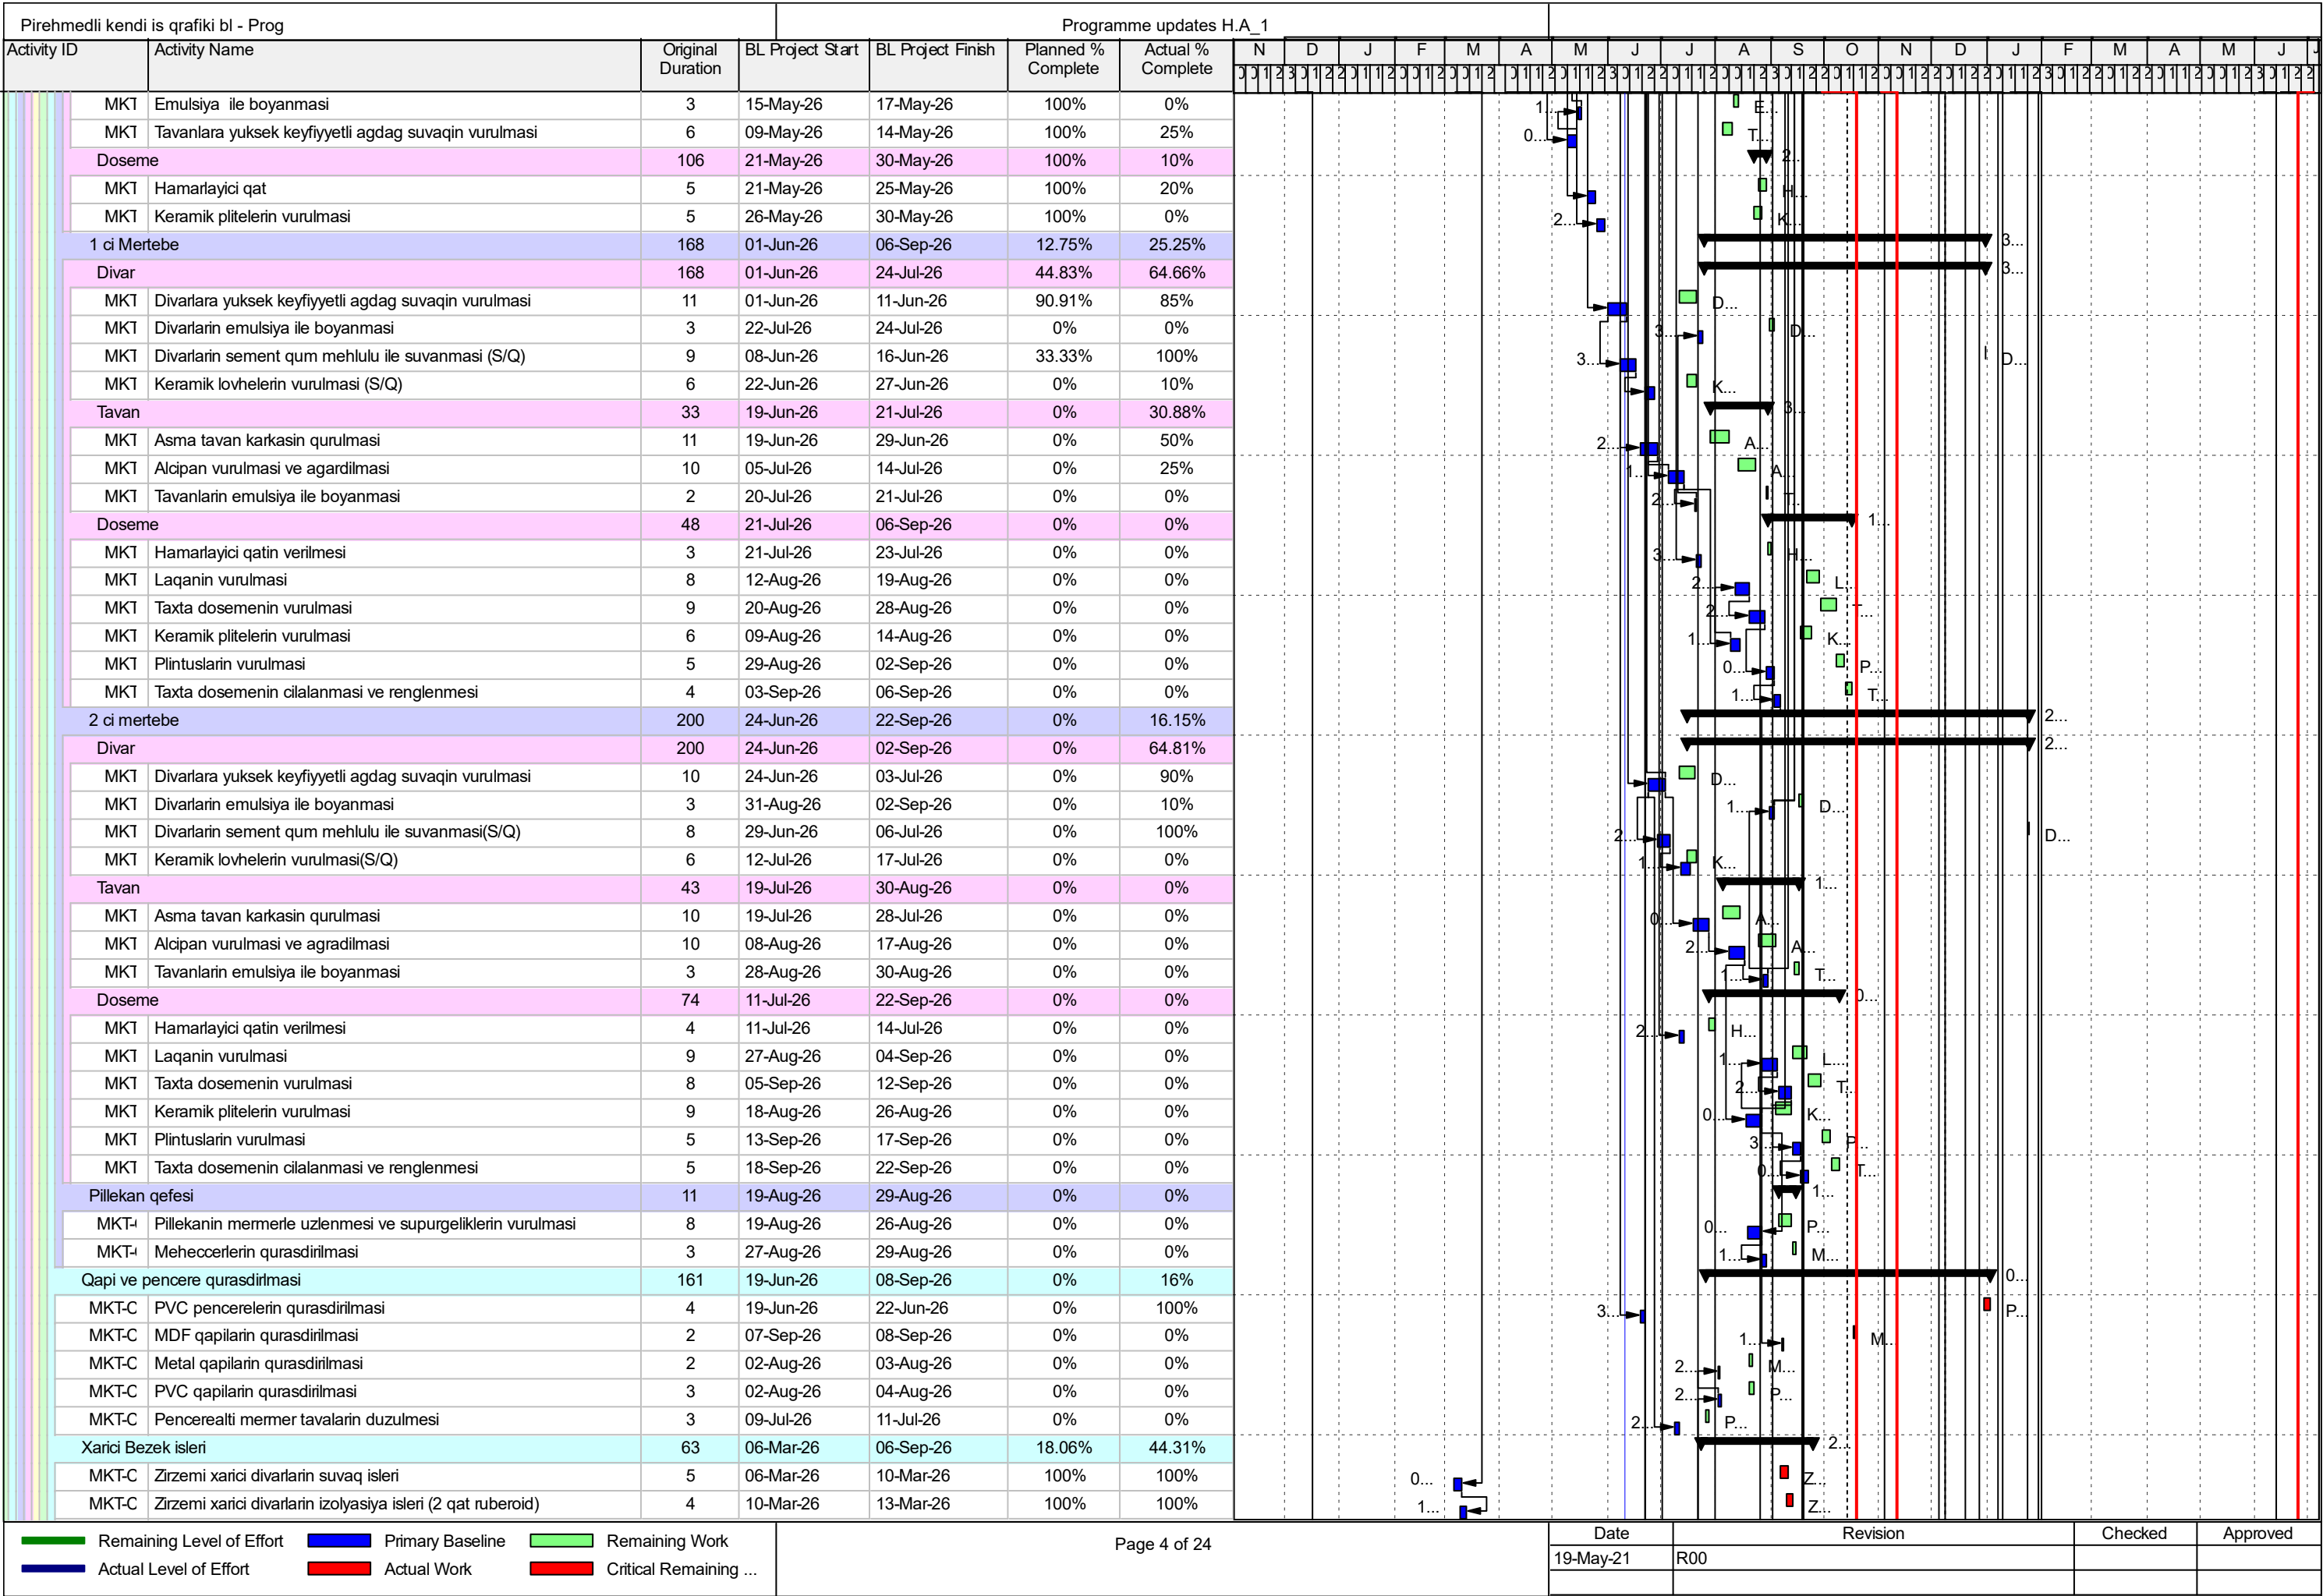


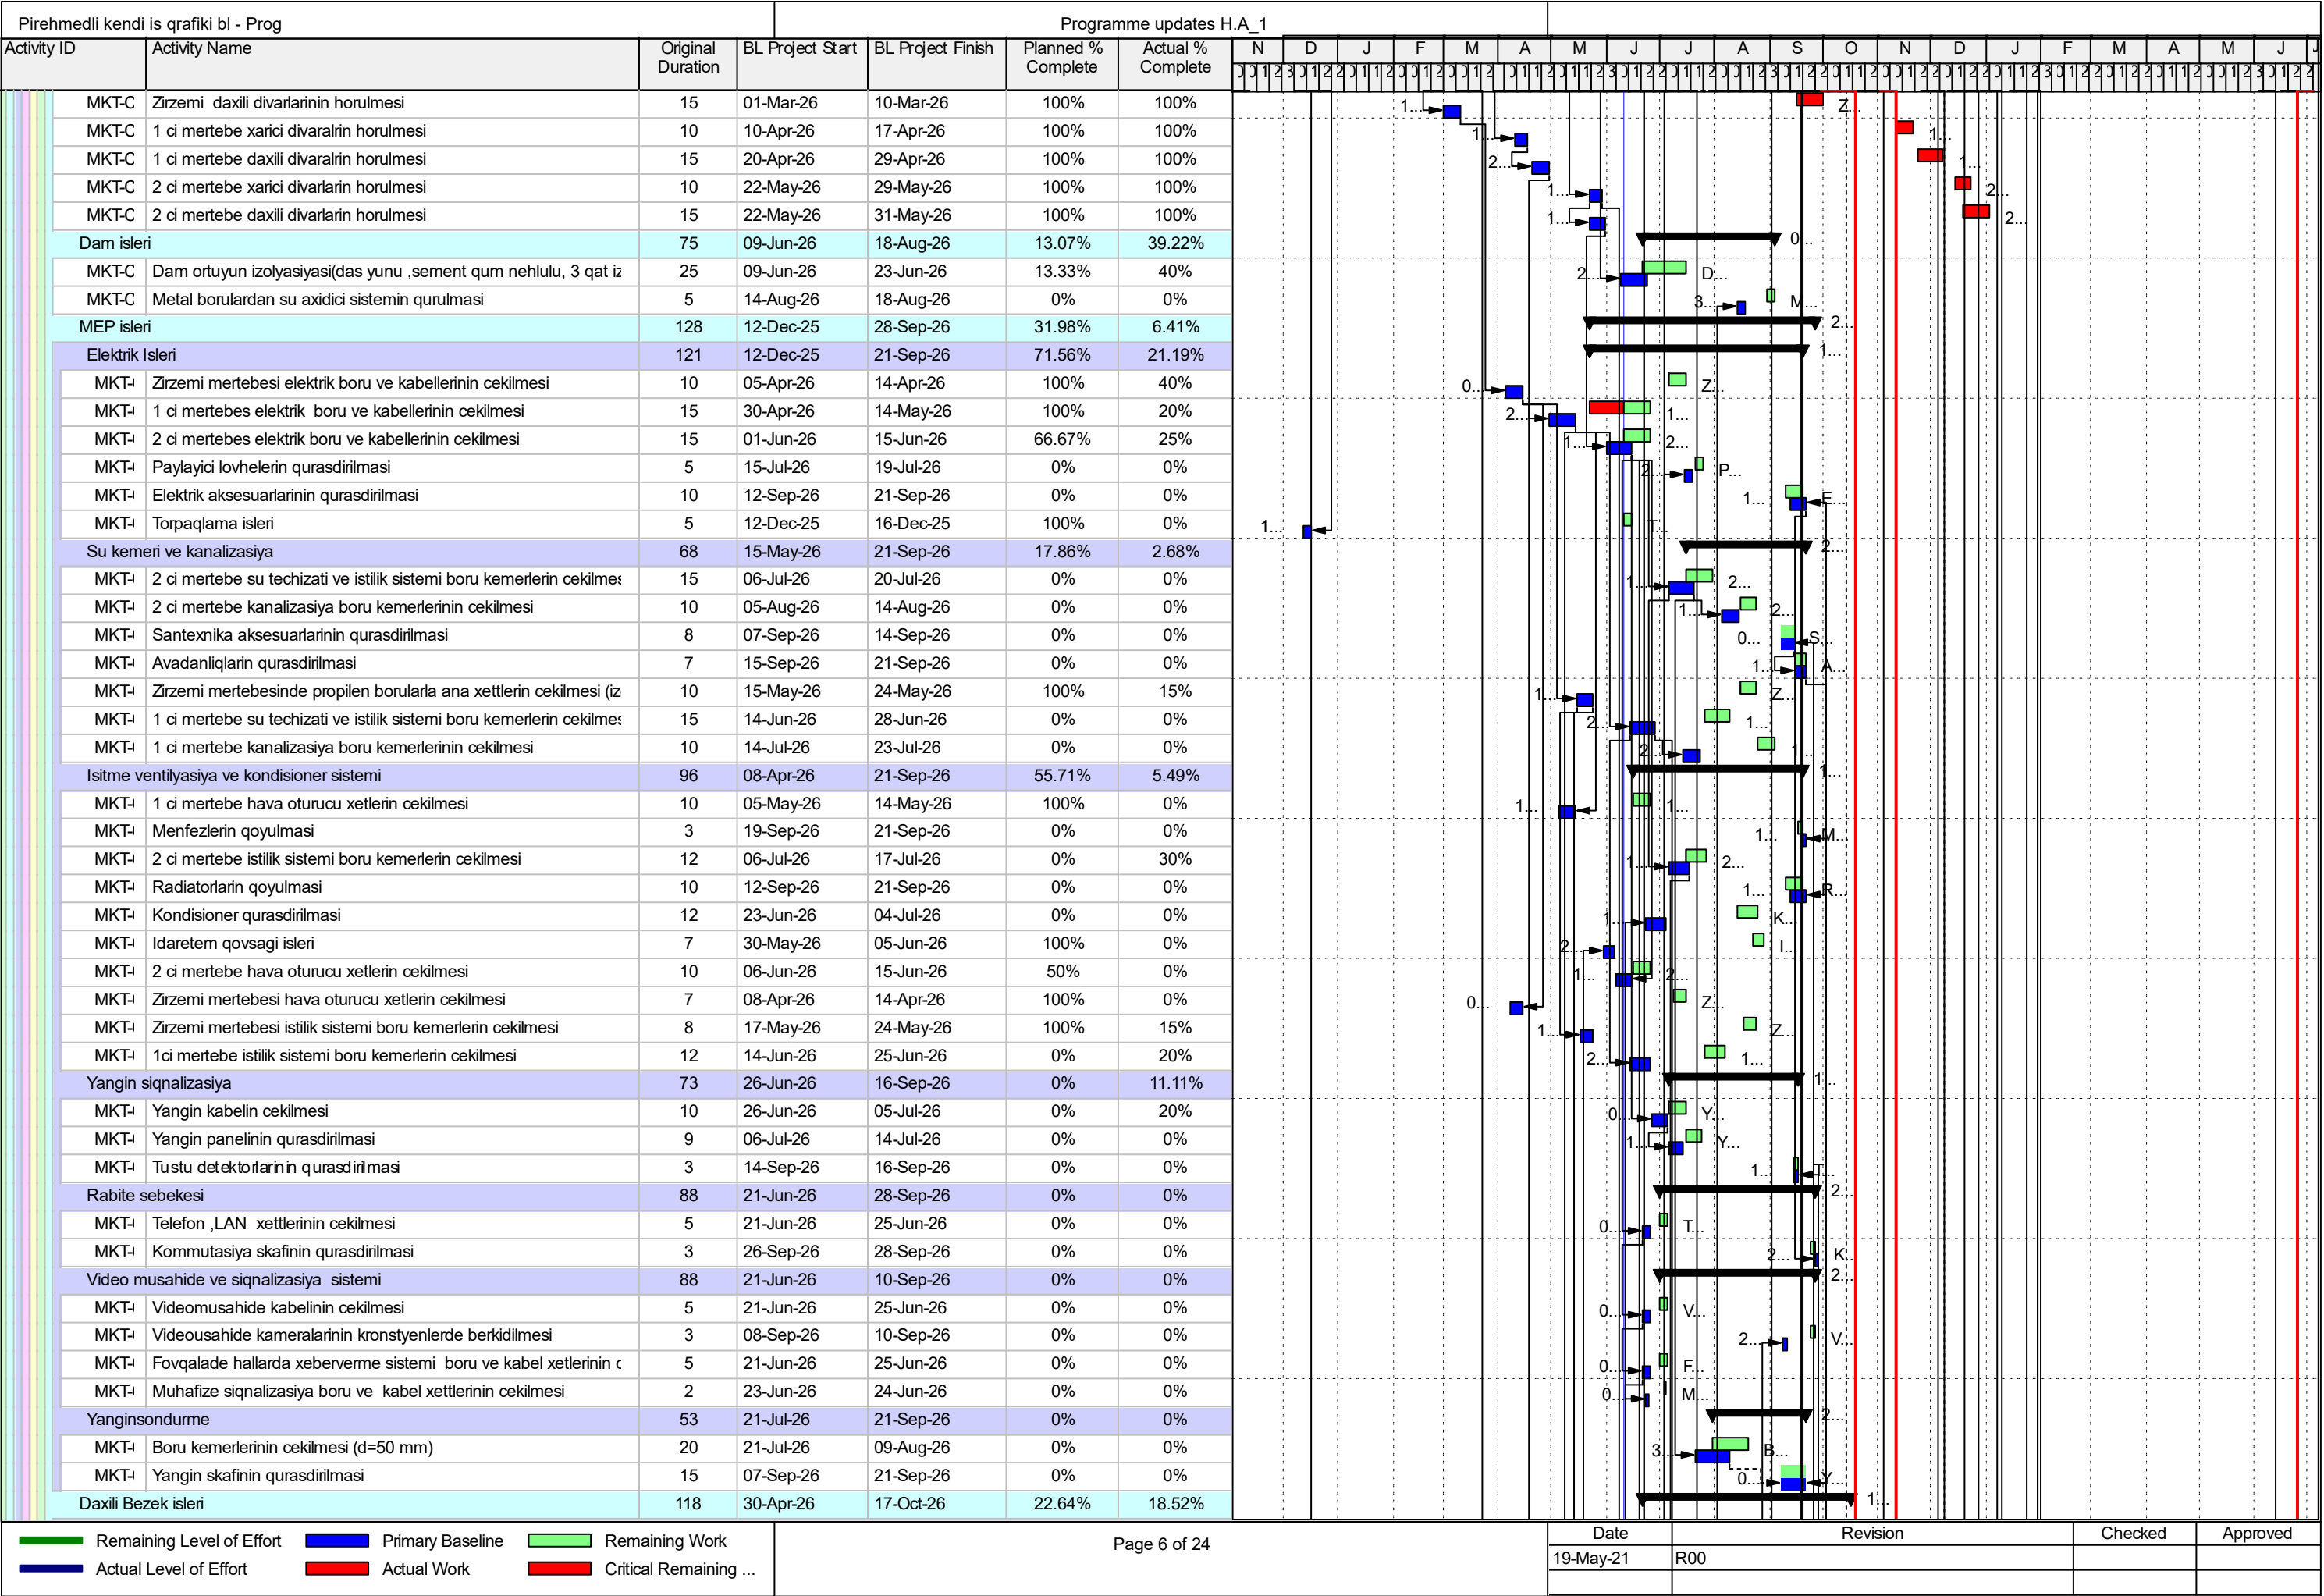


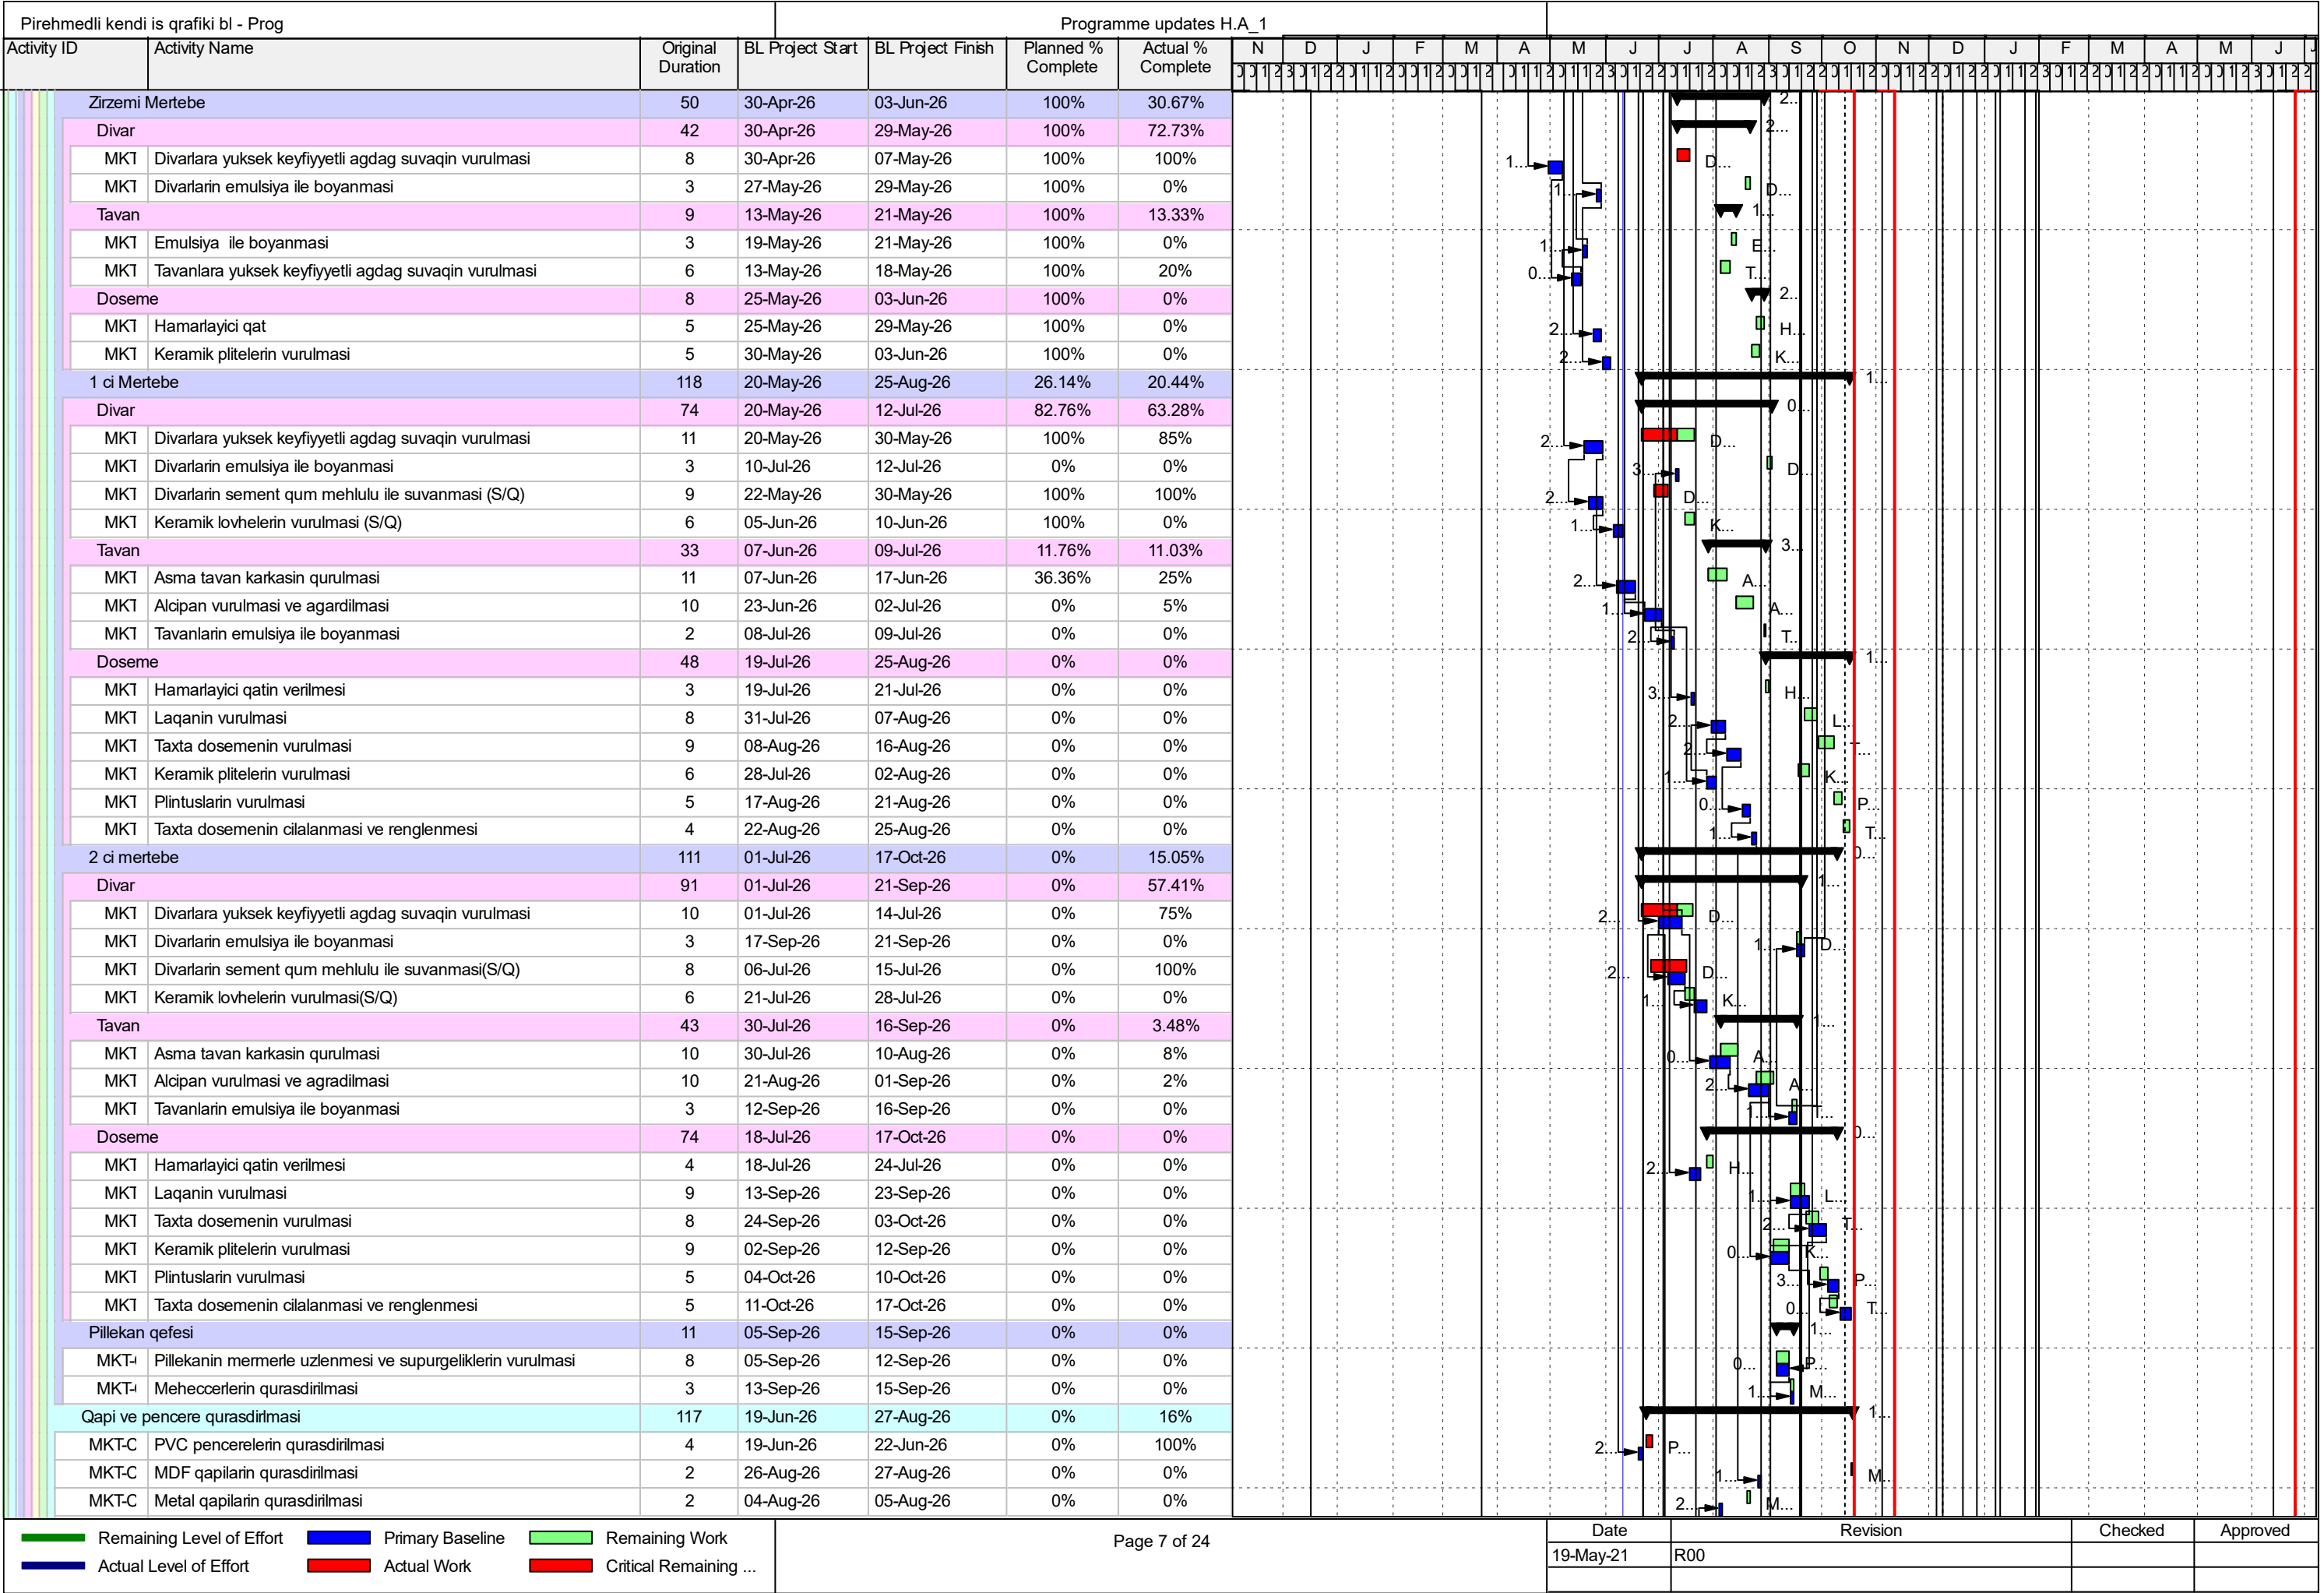

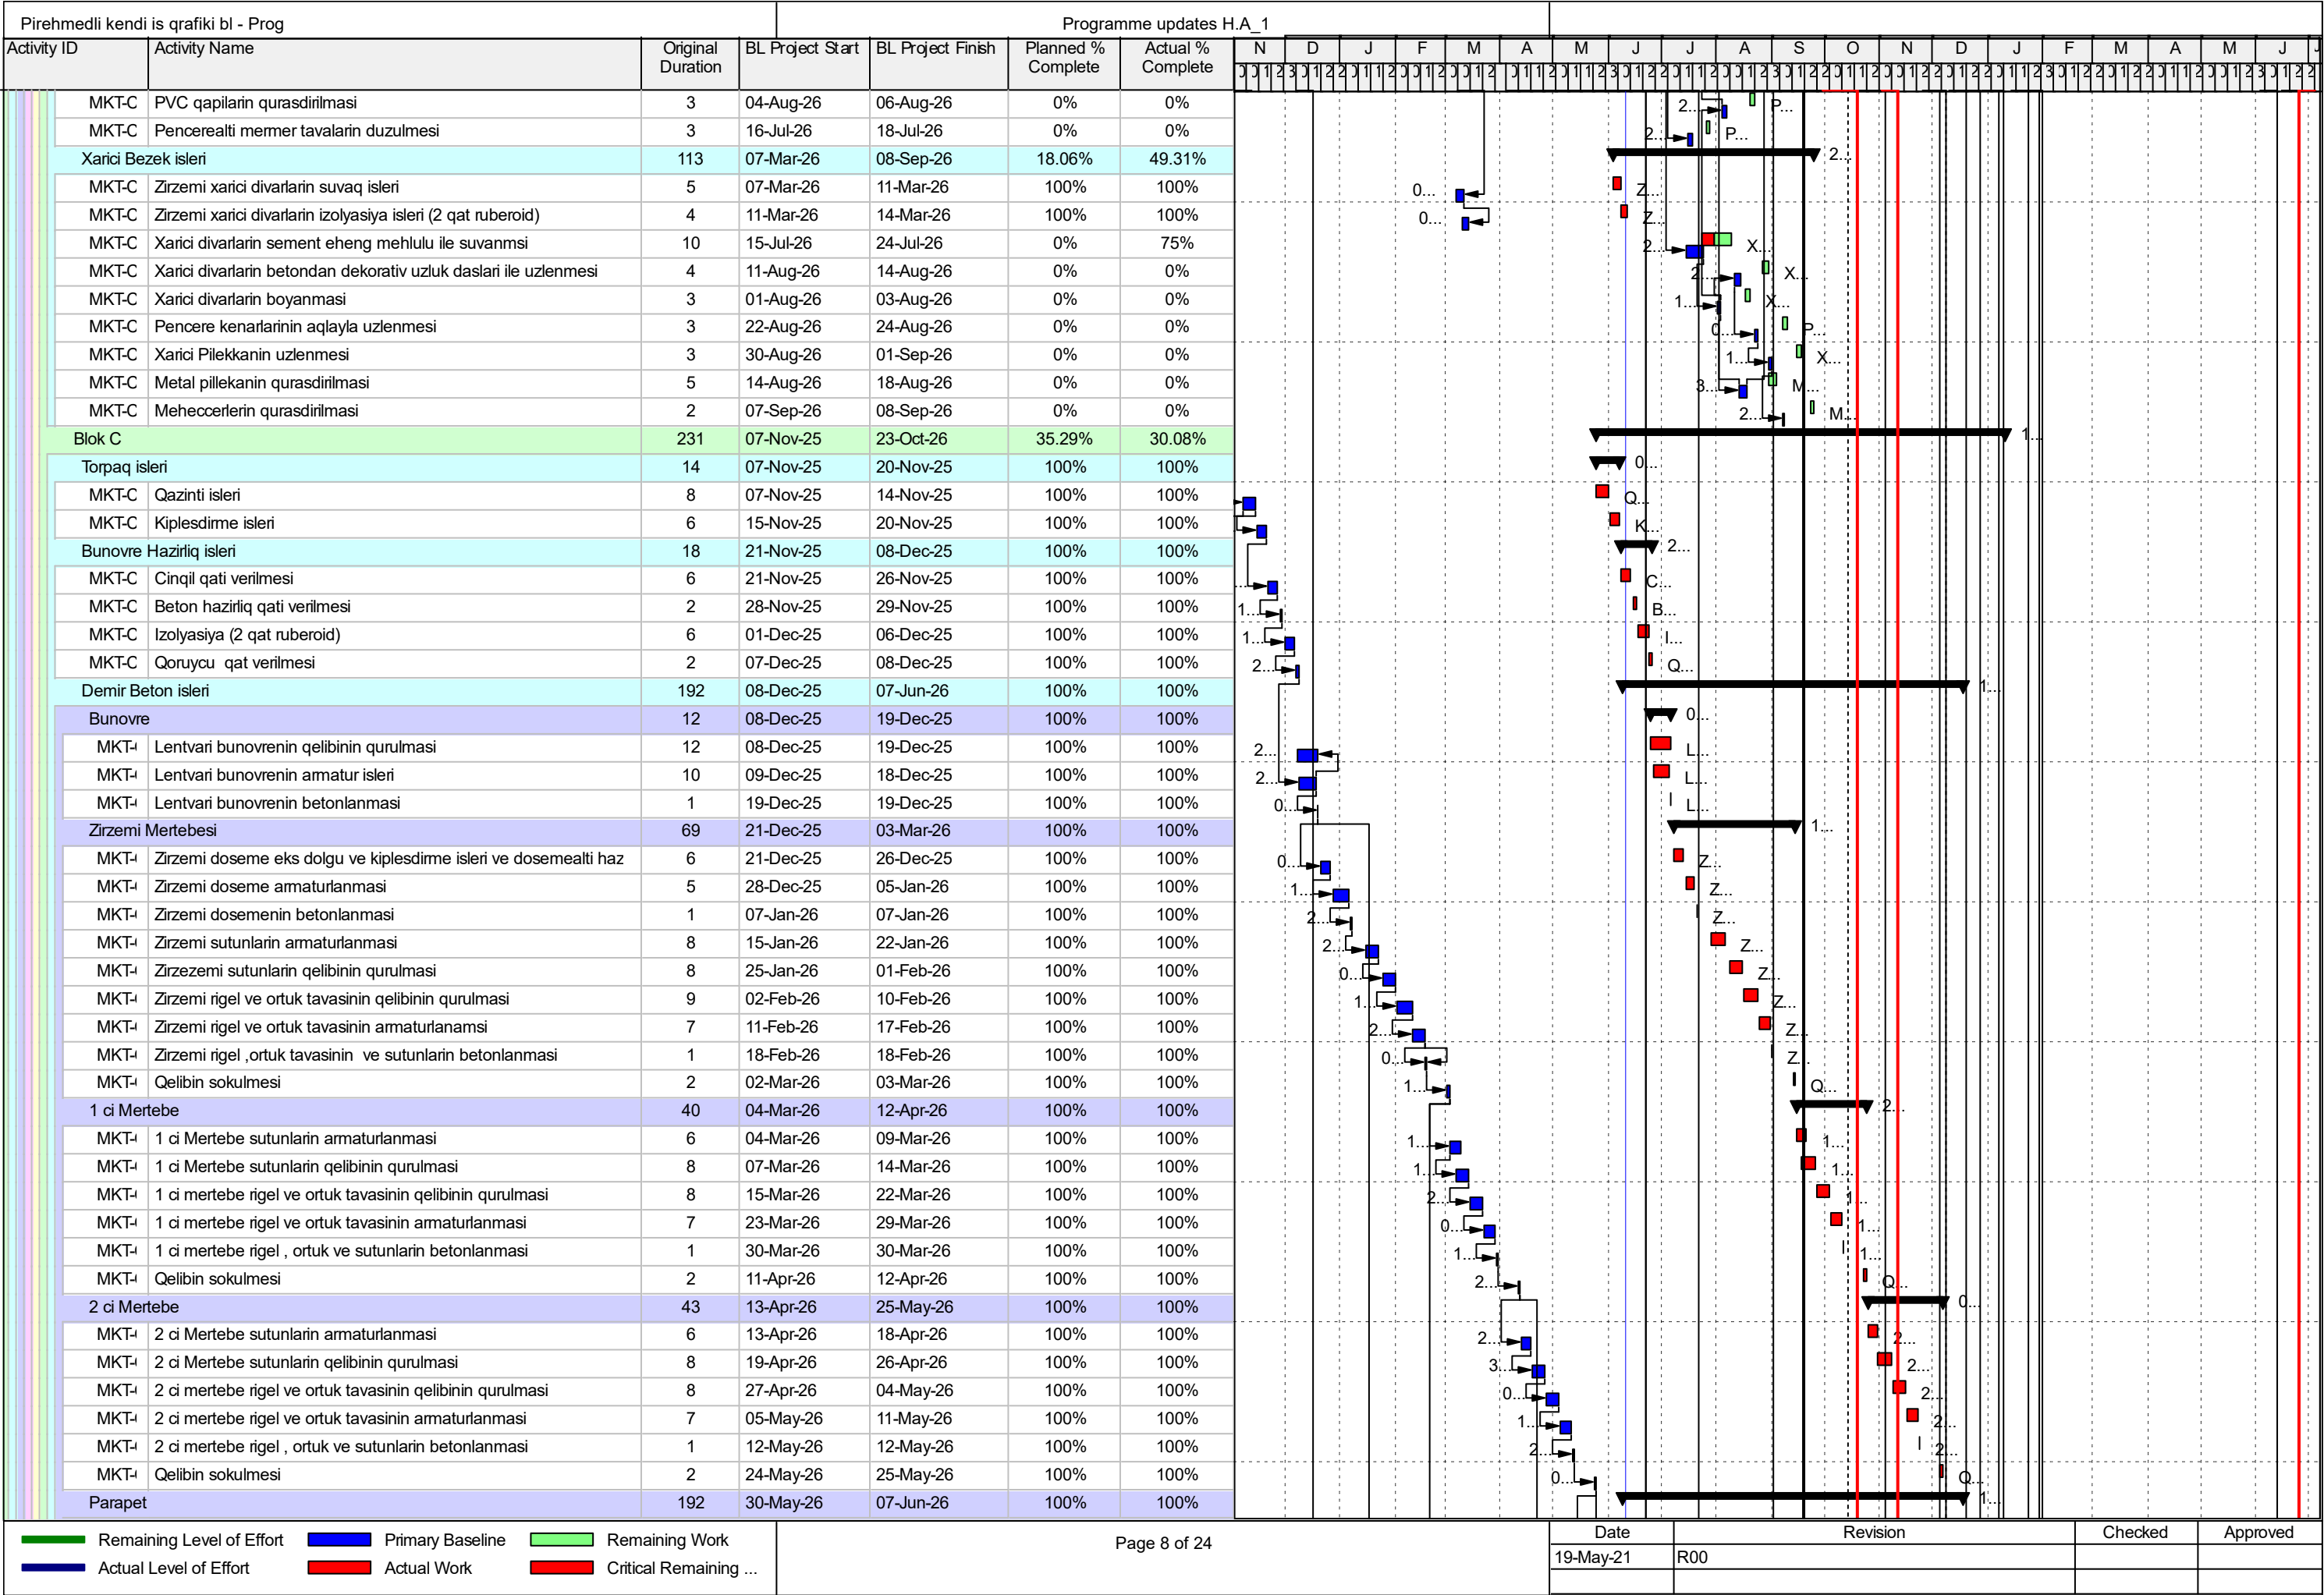


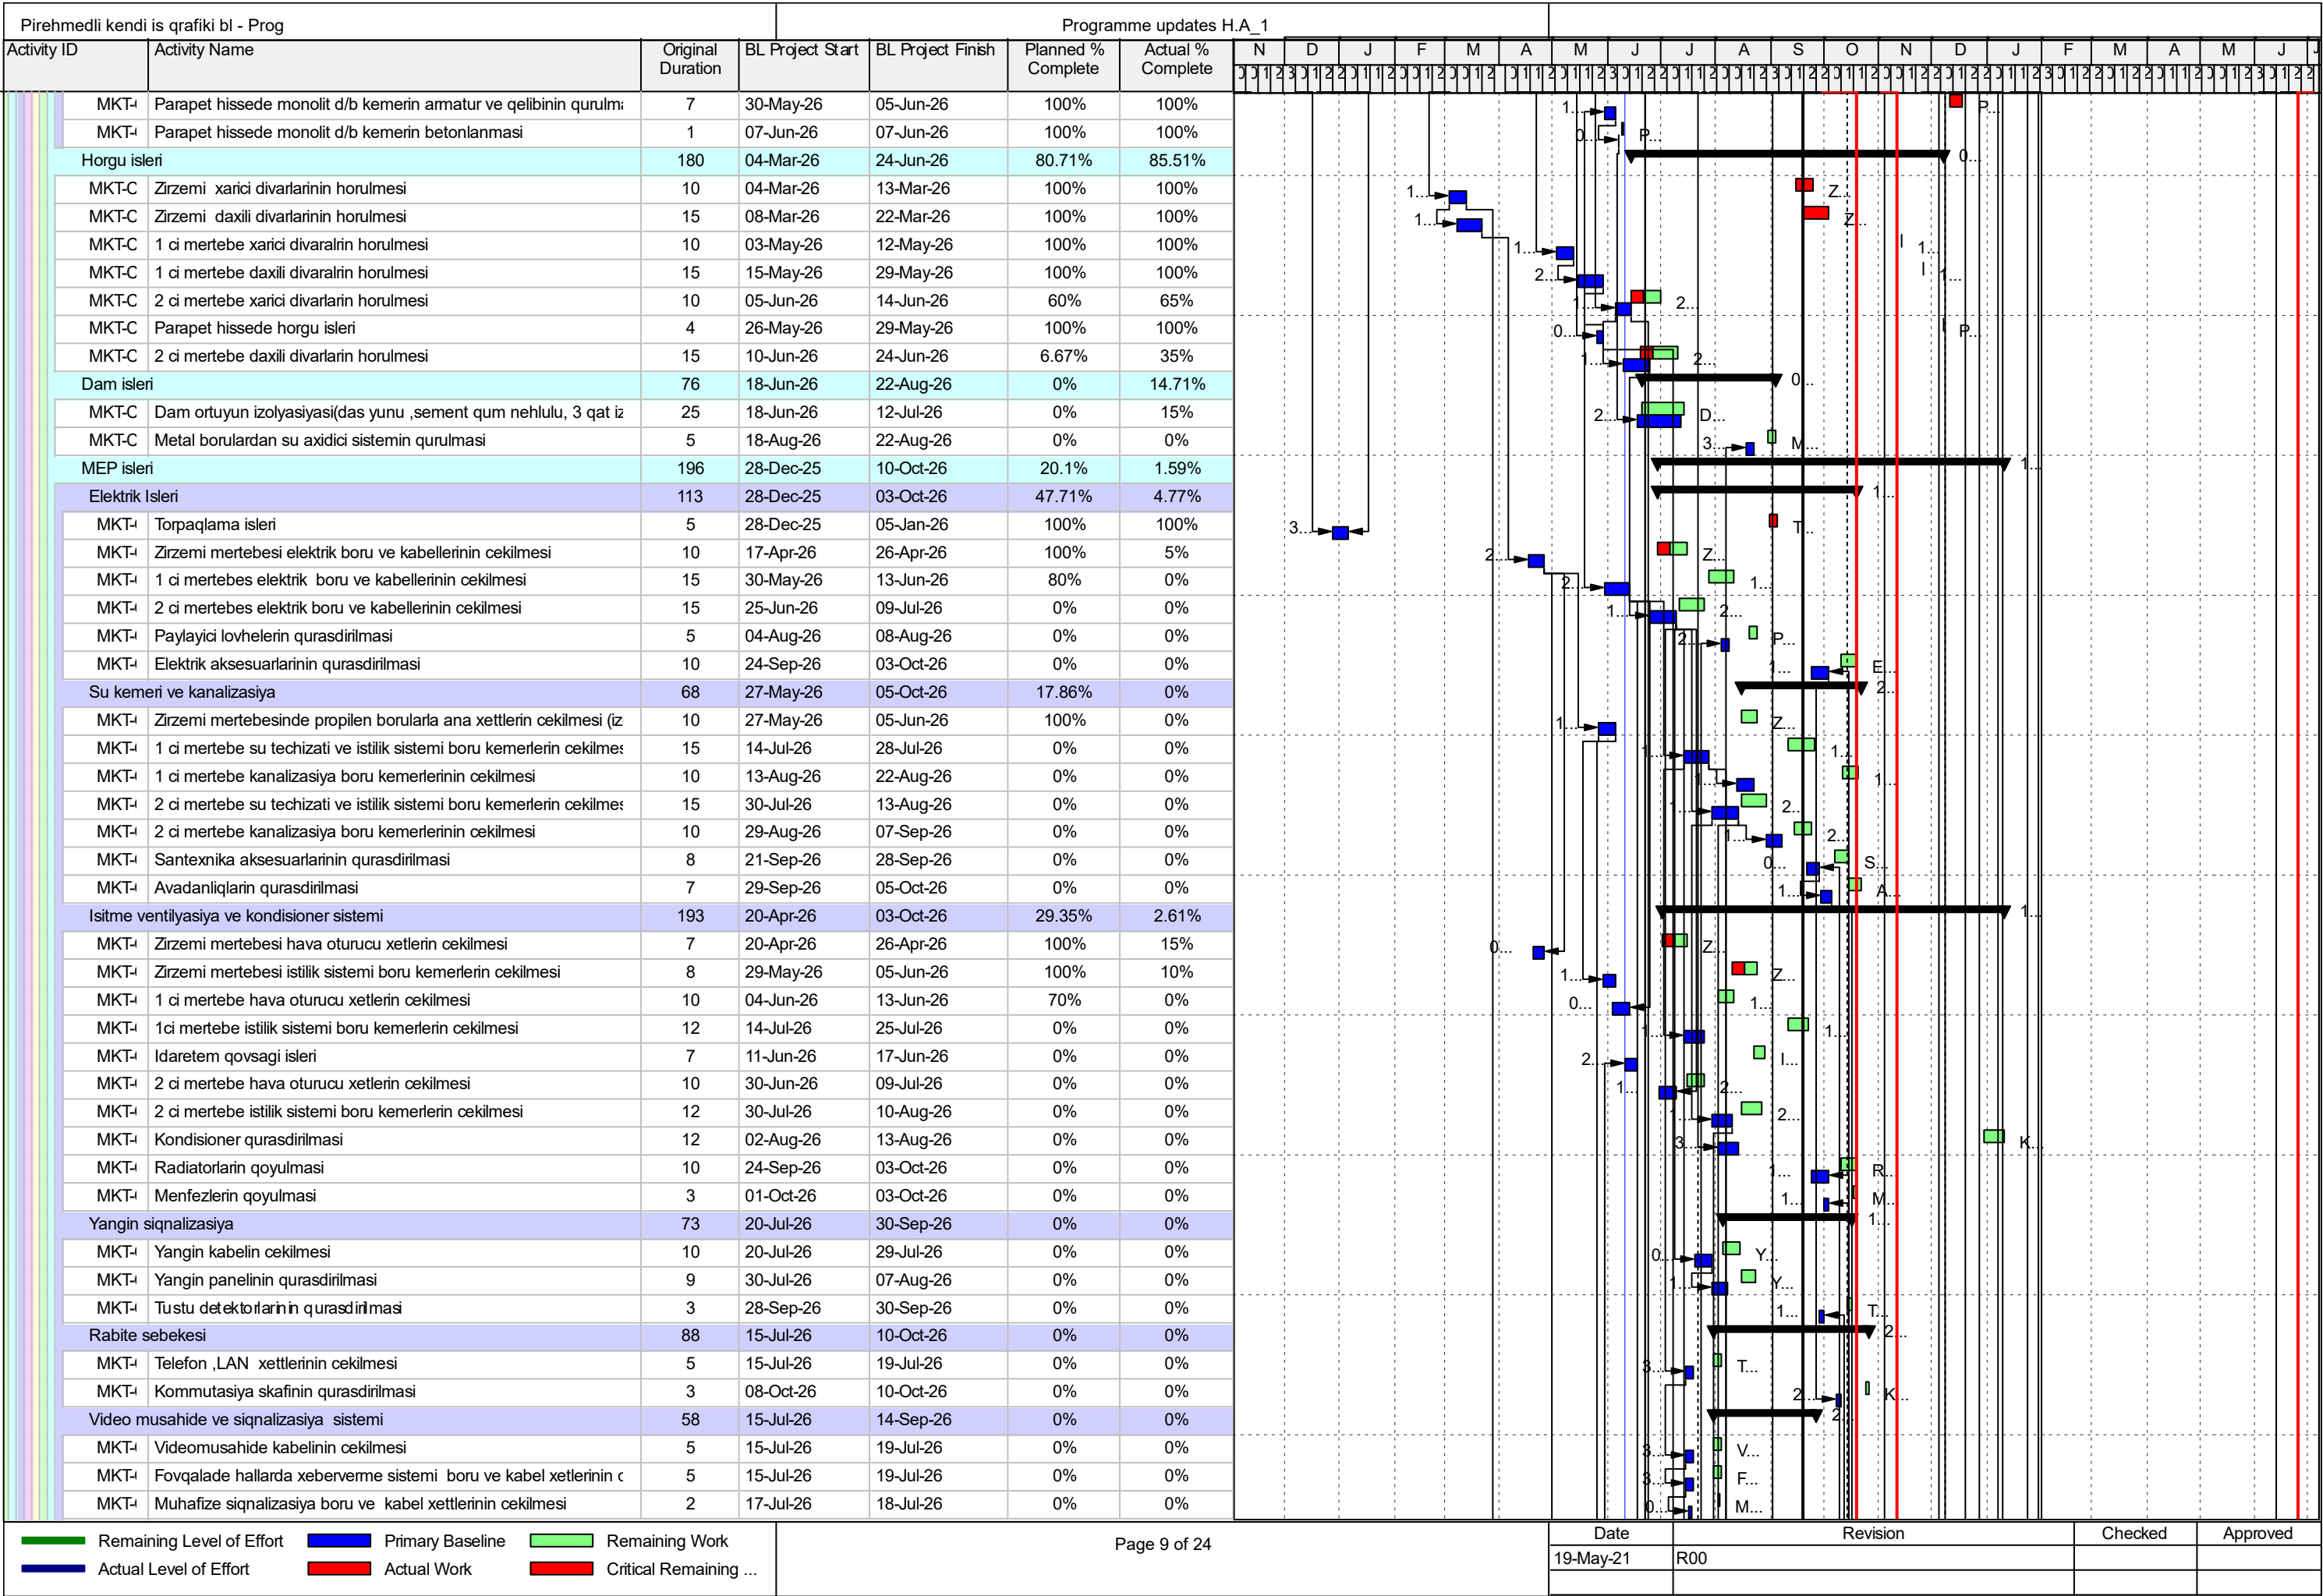


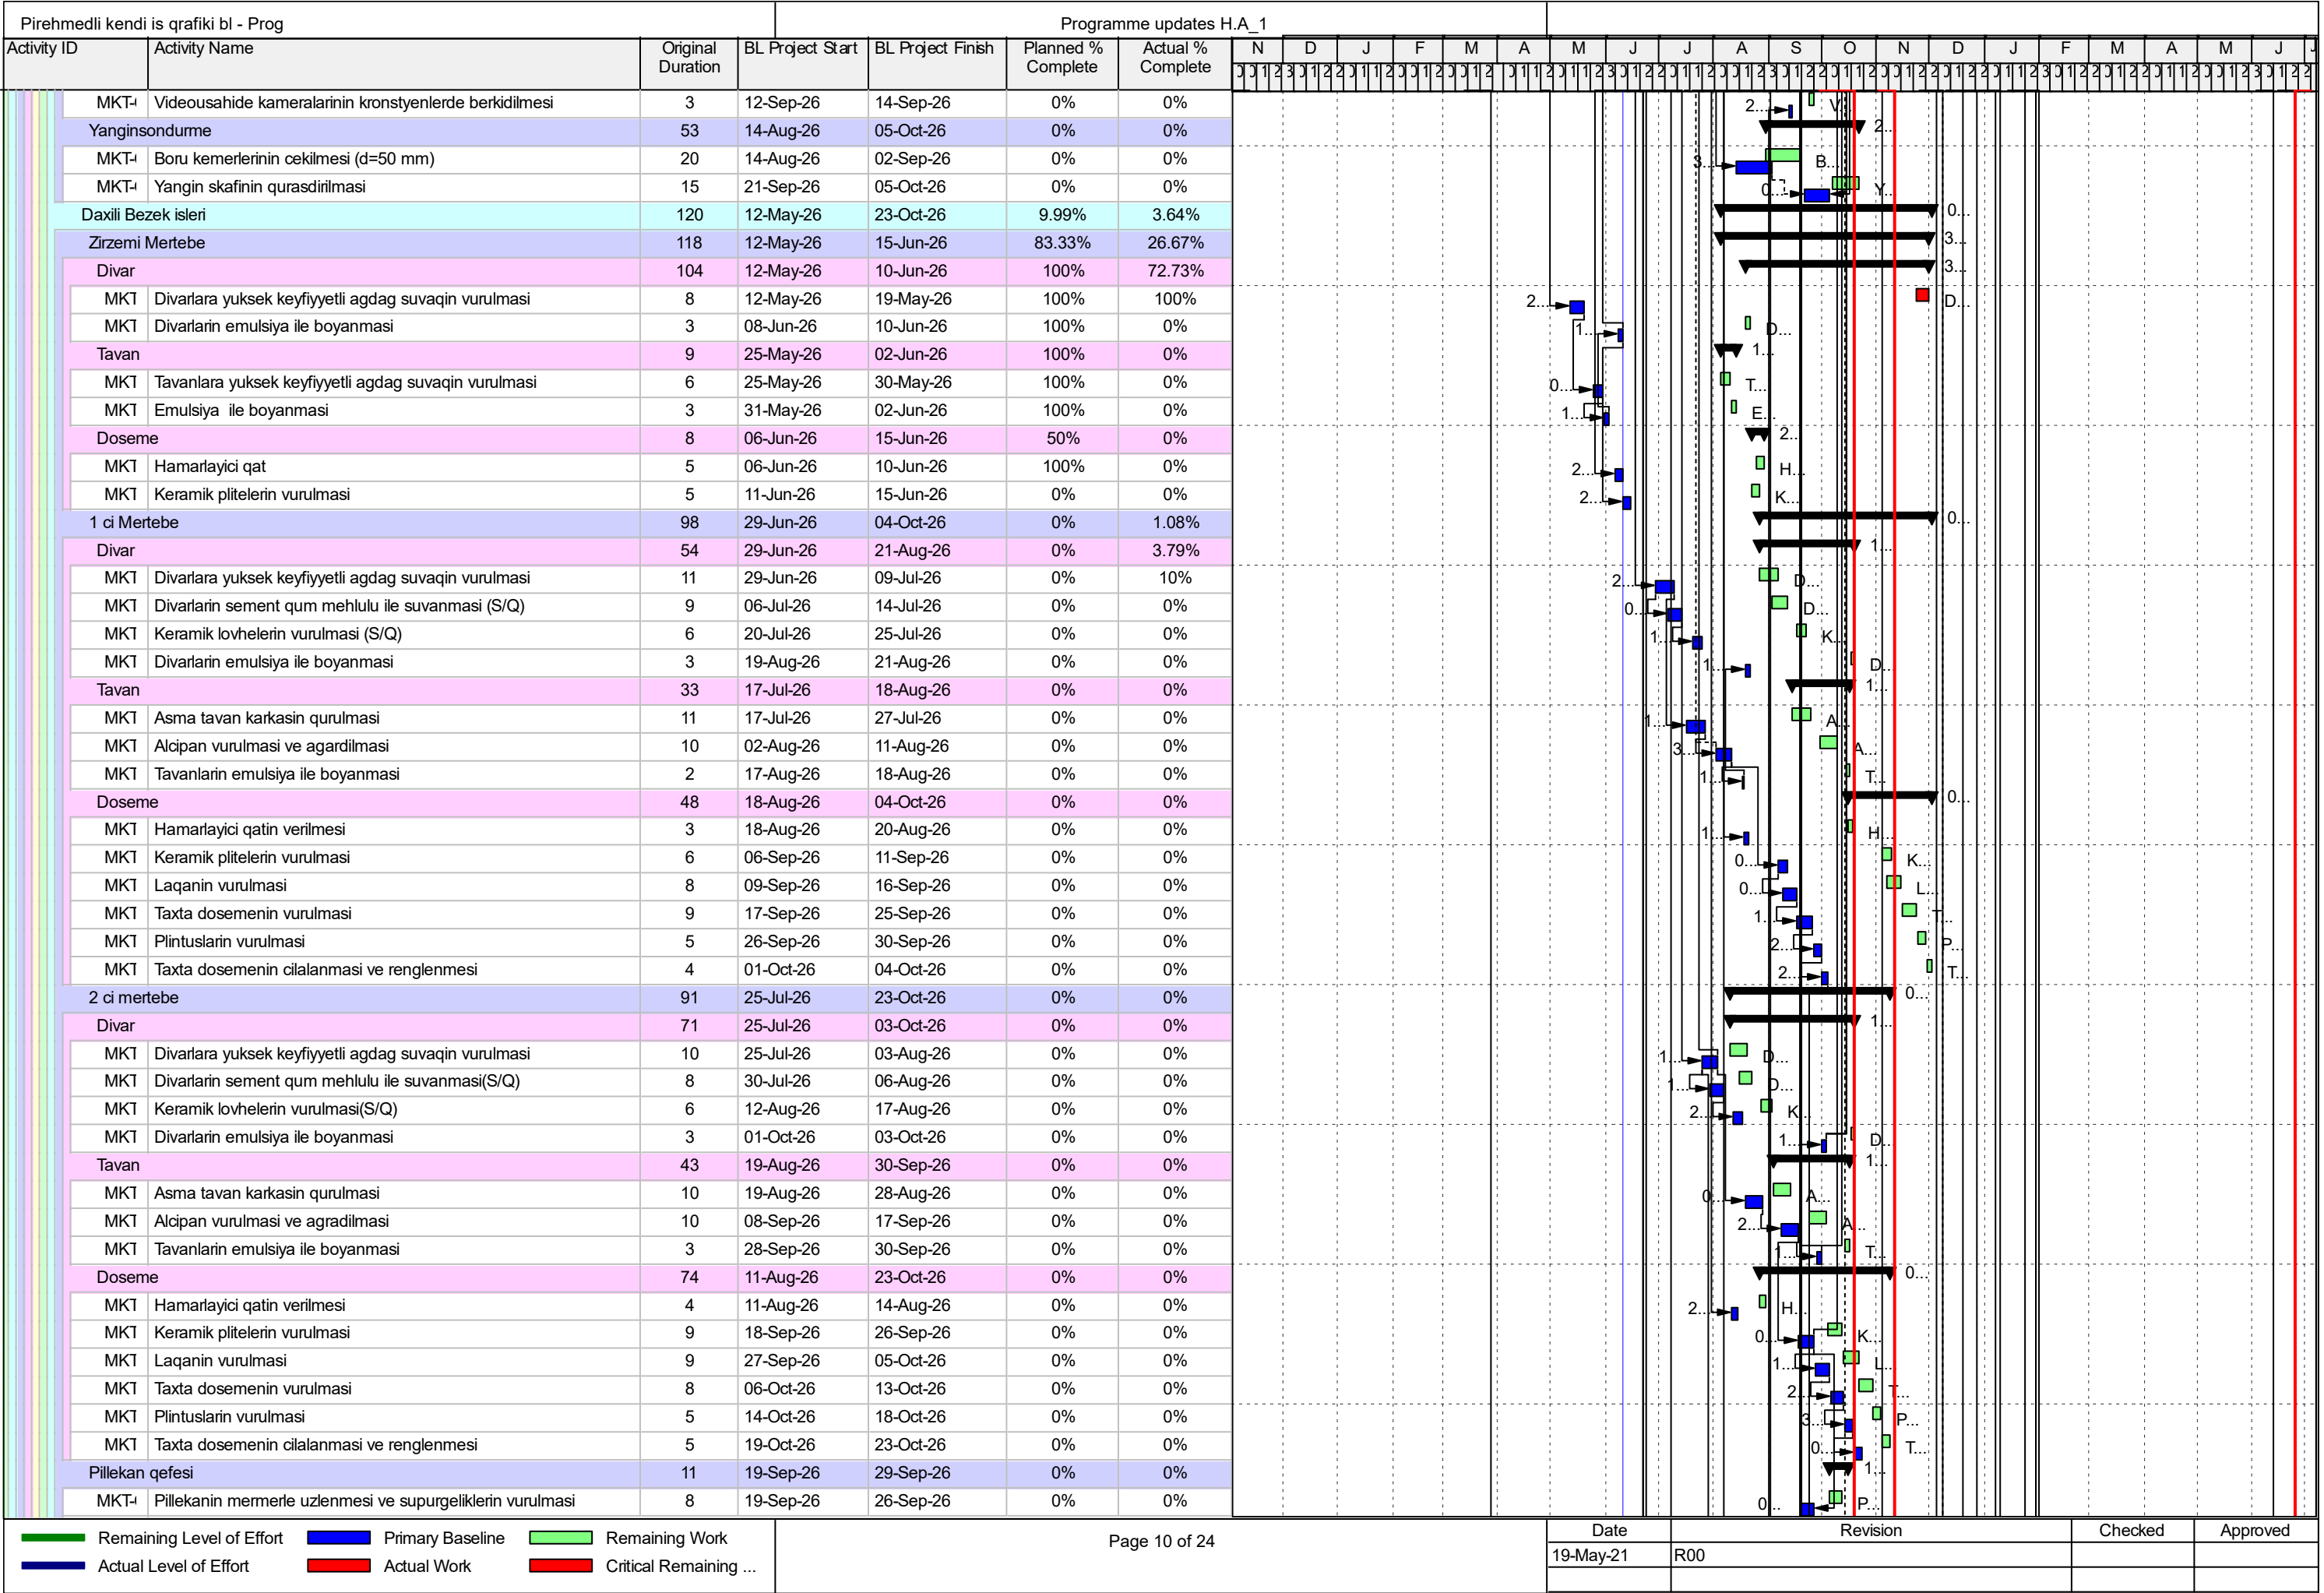


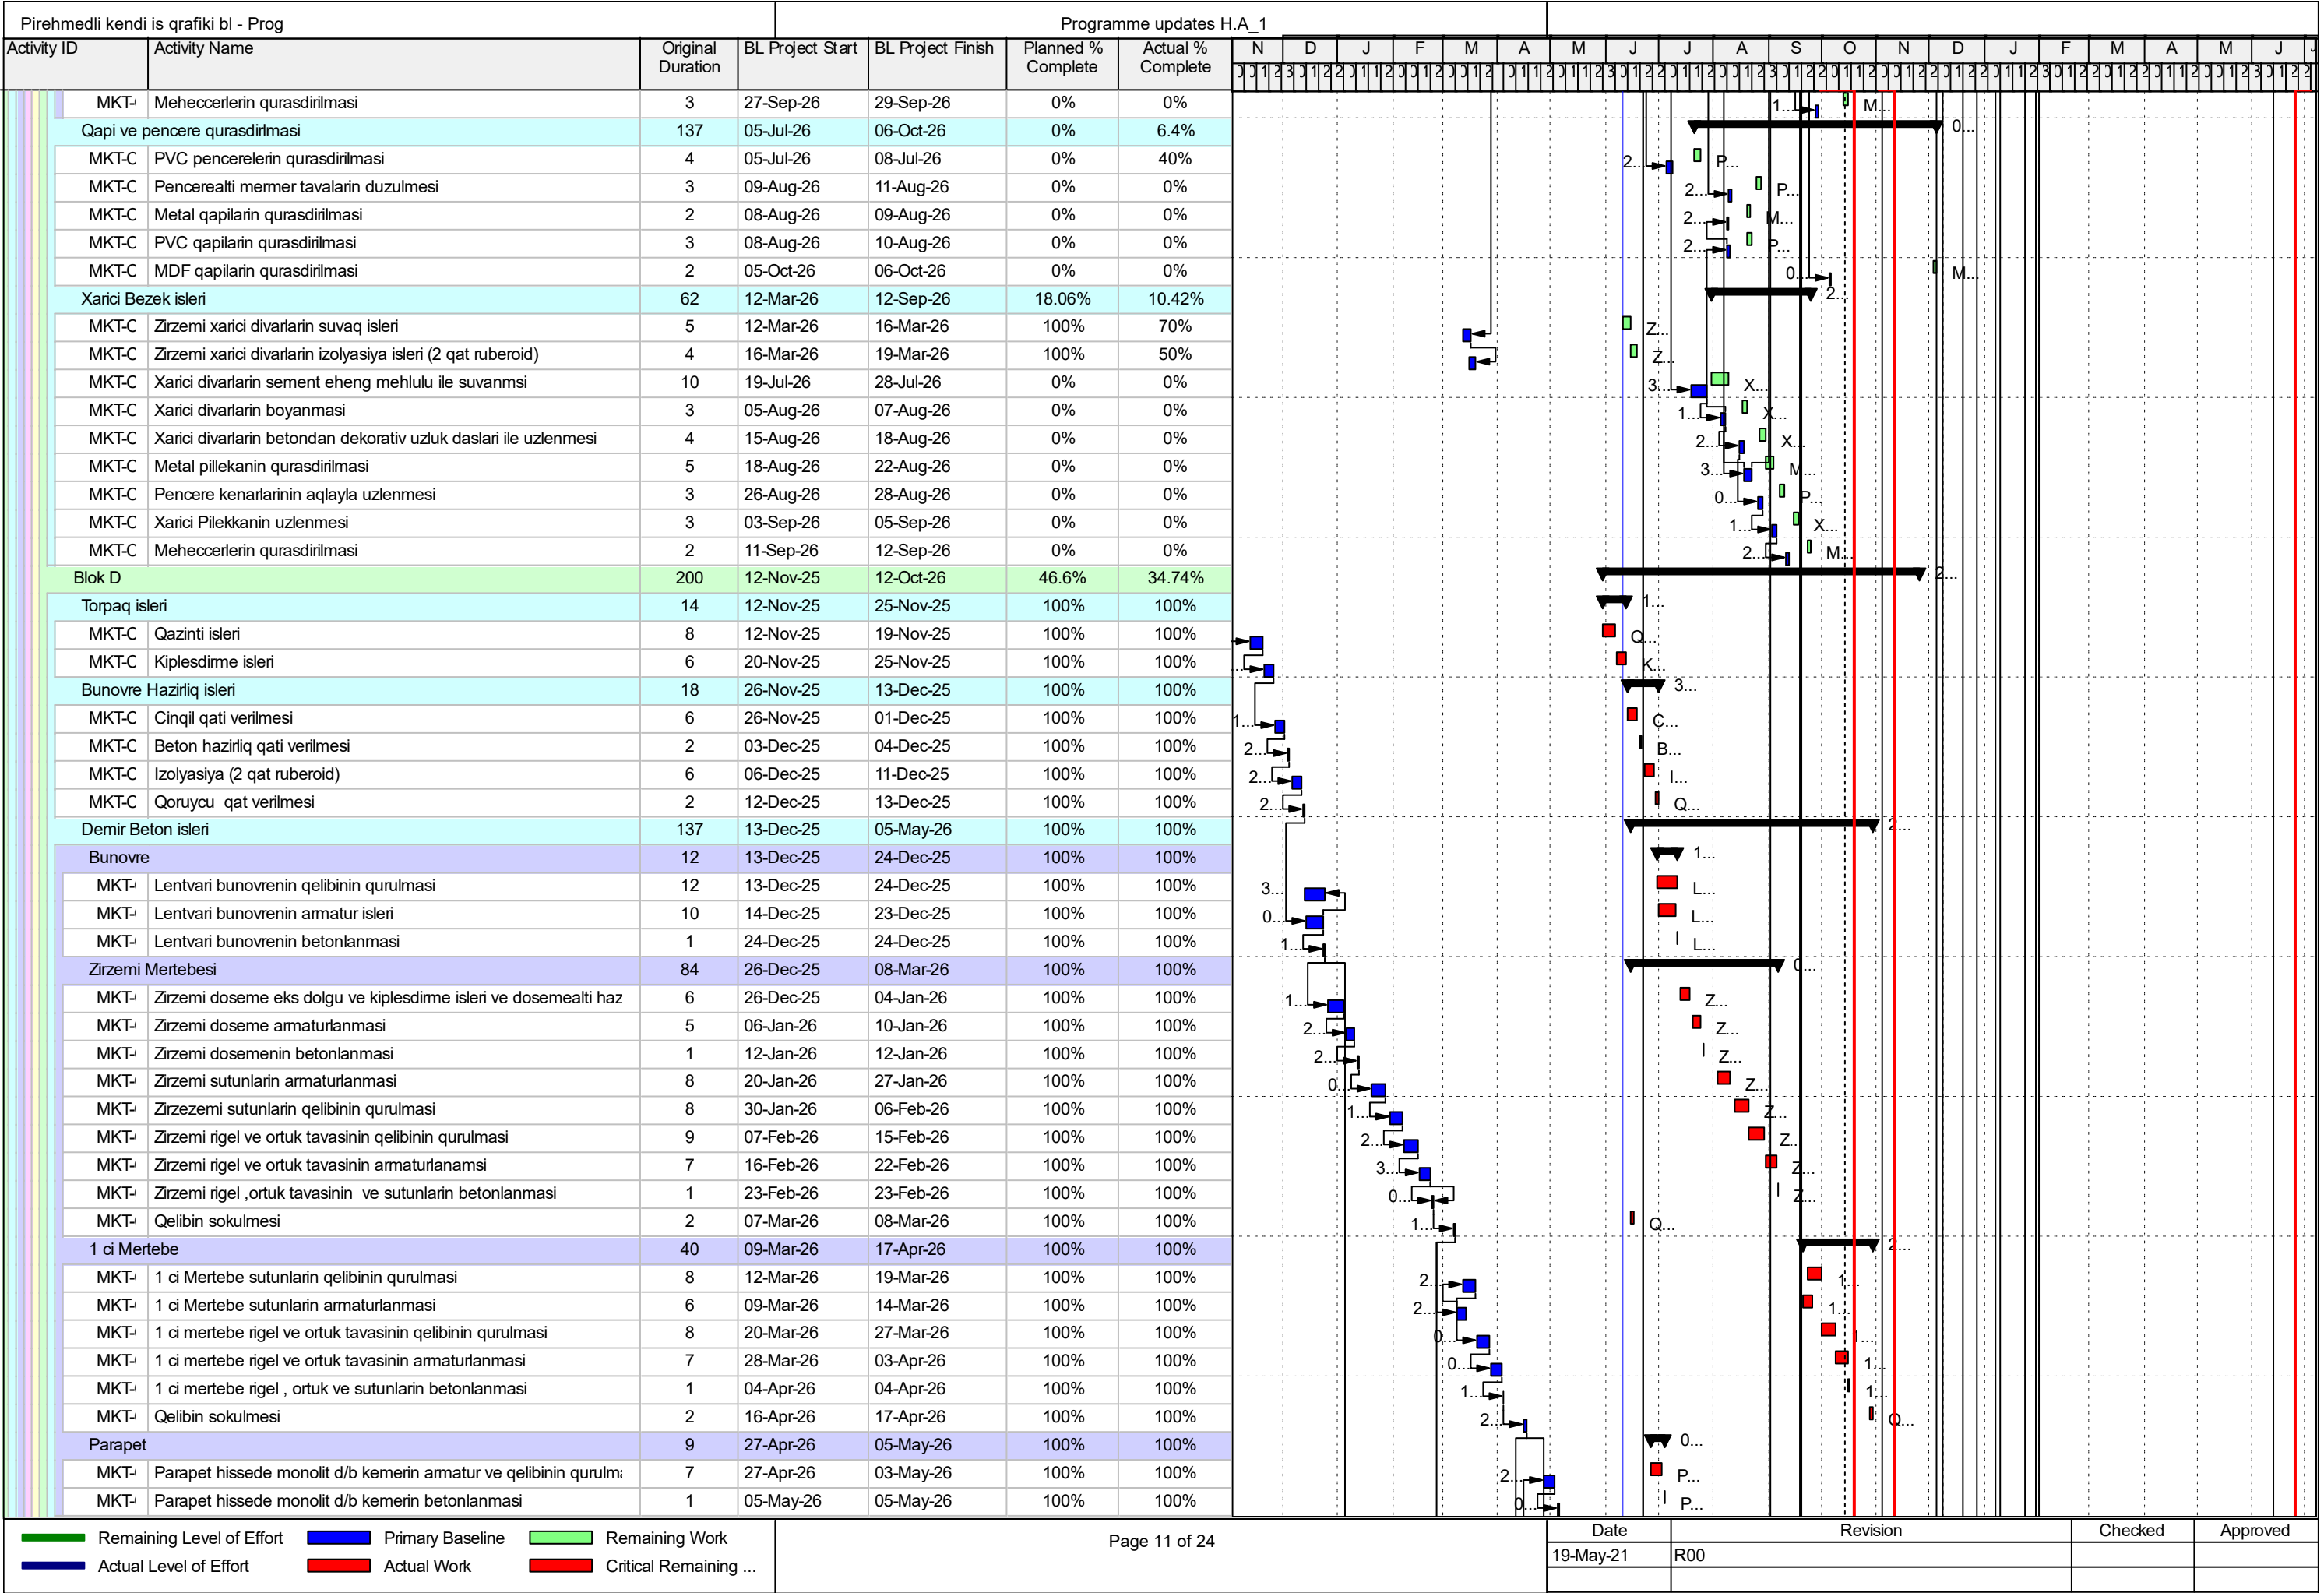

Pirehmedli kendi is grafiki bl - Prog			Programme updates H.A_1																															
Activity ID	Activity Name	Original Duration	BL Project Start	BL Project Finish	Planned % Complete	Actual % Complete	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J							
	Tavan	9	30-May-26	07-Jun-26	100%	0%																												
MKT	Emulsiya ile boyanmasi	3	05-Jun-26	07-Jun-26	100%	0%																												
MKT	Tavanlara yuksek keyfiyyetli agdag suvaqin vurulmasi	6	30-May-26	04-Jun-26	100%	0%																												
	Doseme	8	11-Jun-26	20-Jun-26	0%	0%																												
MKT	Hamarlayici qat	5	11-Jun-26	15-Jun-26	0%	0%																												
MKT	Keramik plitelerin vurulmasi	5	16-Jun-26	20-Jun-26	0%	0%																												
	1 ci Mertebe	98	04-Jul-26	09-Oct-26	0%	1.62%																												
	Divar	54	04-Jul-26	26-Aug-26	0%	5.69%																												
MKT	Divarlara yuksek keyfiyyetli agdag suvaqin vurulmasi	11	04-Jul-26	14-Jul-26	0%	15%																												
MKT	Divarlarin emulsiya ile boyanmasi	3	24-Aug-26	26-Aug-26	0%	0%																												
MKT	Divarlarin sement qum mehlulu ile suvanmasi (S/Q)	9	11-Jul-26	19-Jul-26	0%	0%																												
MKT	Keramik lovhelerin vurulmasi (S/Q)	6	25-Jul-26	30-Jul-26	0%	0%																												
	Tavan	33	22-Jul-26	23-Aug-26	0%	0%																												
MKT	Asma tavan karkasin kurulmasi	11	22-Jul-26	01-Aug-26	0%	0%																												
MKT	Alcipan vurulmasi ve agardilmasi	10	07-Aug-26	16-Aug-26	0%	0%																												
MKT	Tavanlarin emulsiya ile boyanmasi	2	22-Aug-26	23-Aug-26	0%	0%																												
	Doseme	48	23-Aug-26	09-Oct-26	0%	0%																												
MKT	Hamarlayici qatin verilmesi	3	23-Aug-26	25-Aug-26	0%	0%																												
MKT	Laqanin vurulmasi	8	14-Sep-26	21-Sep-26	0%	0%																												
MKT	Taxta dosemenin vurulmasi	9	22-Sep-26	30-Sep-26	0%	0%																												
MKT	Keramik plitelerin vurulmasi	6	11-Sep-26	16-Sep-26	0%	0%																												
MKT	Plintuslarin vurulmasi	5	01-Oct-26	05-Oct-26	0%	0%																												
MKT	Taxta dosemenin cilalanmasi ve renglenmesi	4	06-Oct-26	09-Oct-26	0%	0%																												
	Pillekan qefesi	11	02-Oct-26	12-Oct-26	0%	0%																												
MKT	Pillekanin mermerle uzlenmesi ve supurgeliklerin vurulmasi	8	02-Oct-26	09-Oct-26	0%	0%																												
MKT	Mehecceerlerin qurasdirilmasi	3	10-Oct-26	12-Oct-26	0%	0%																												

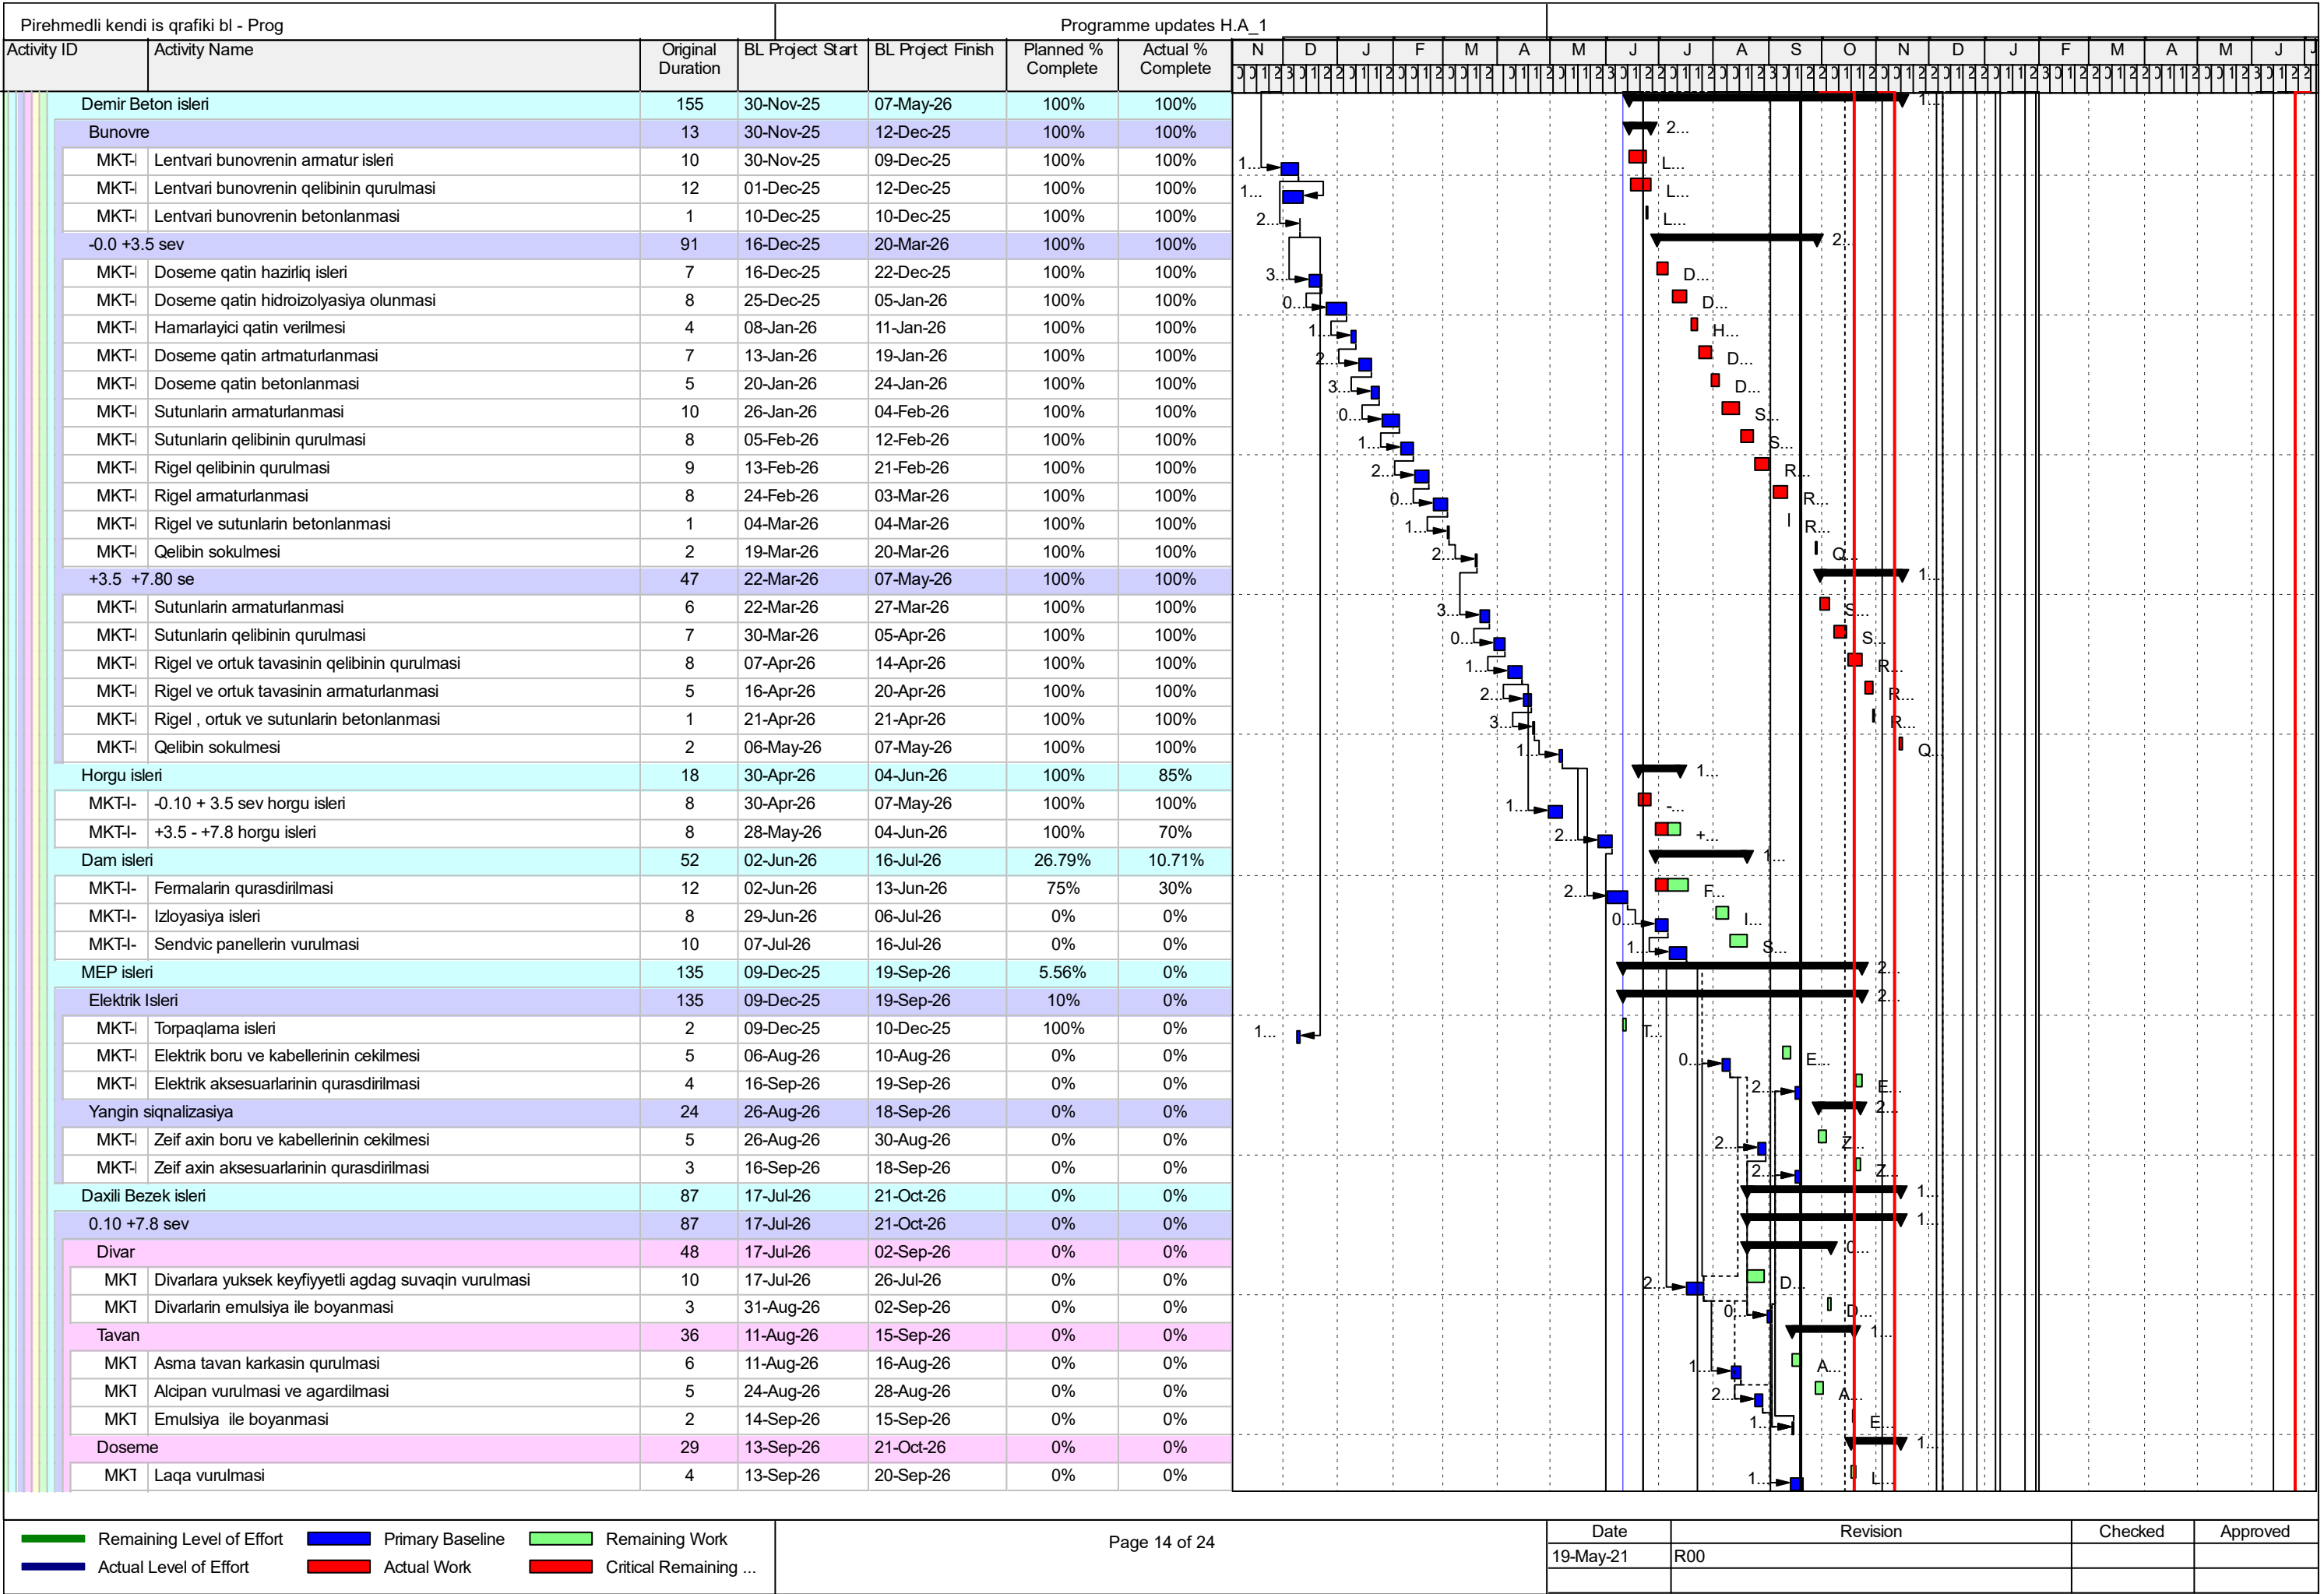

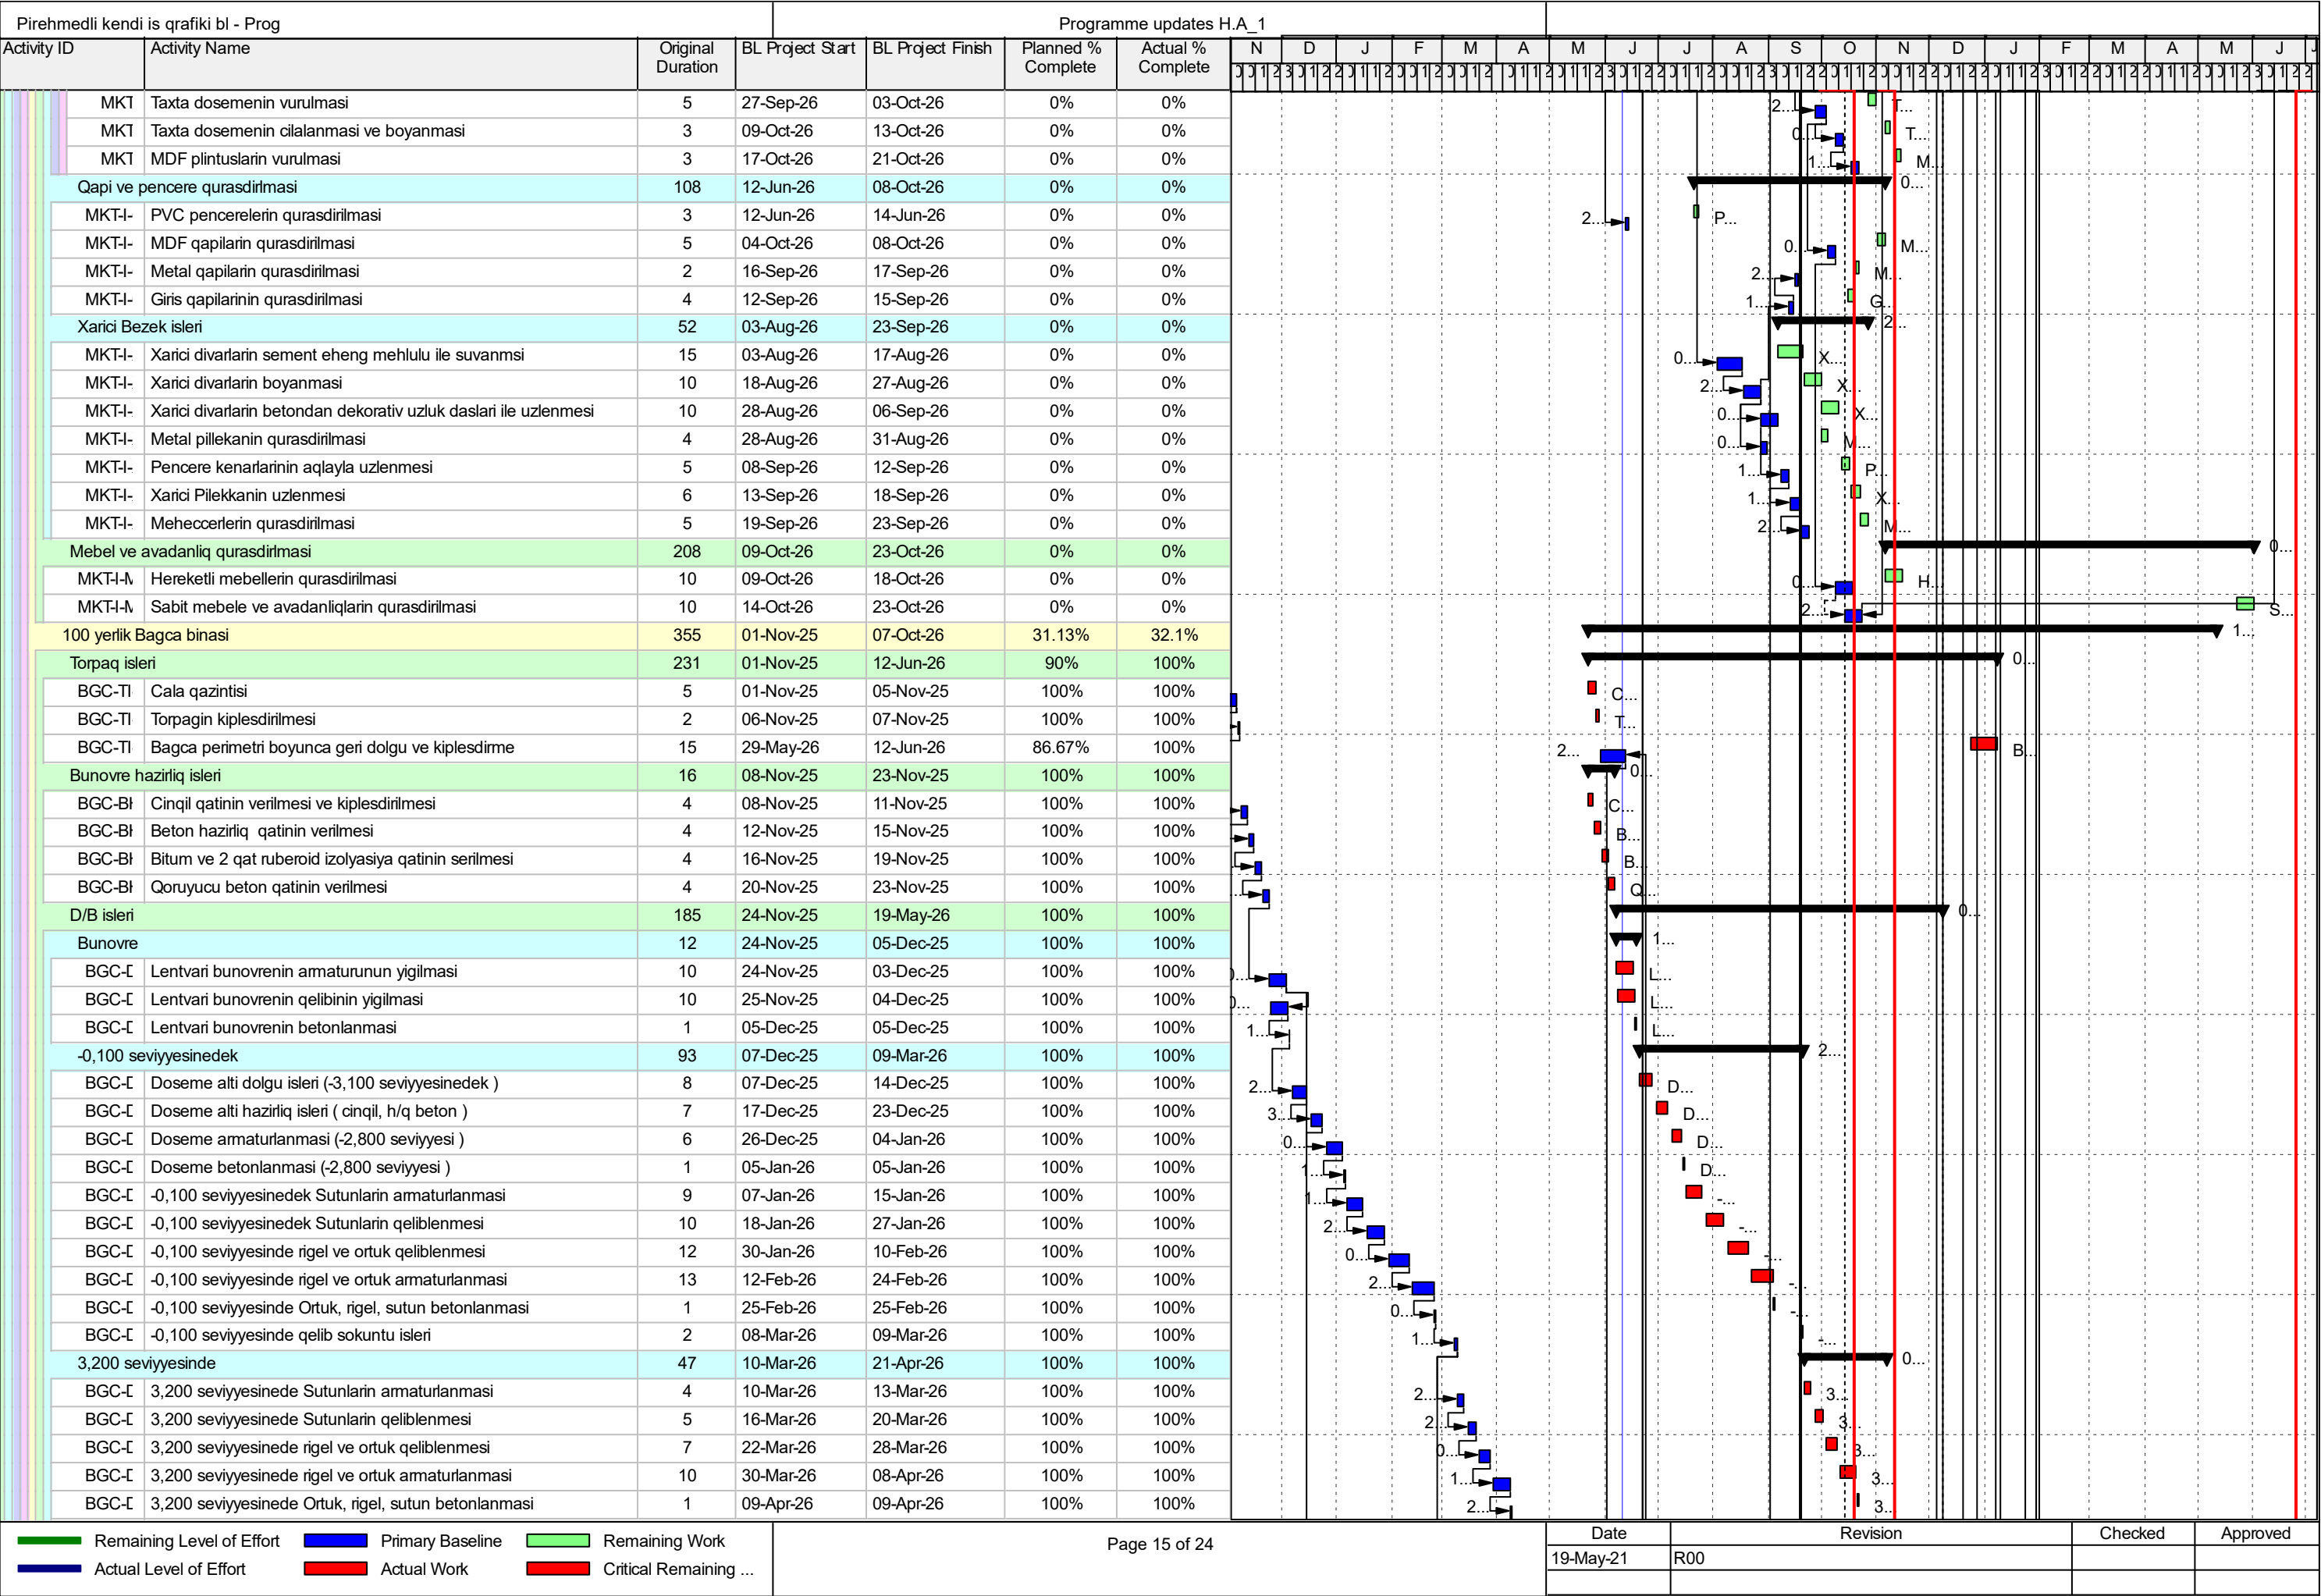

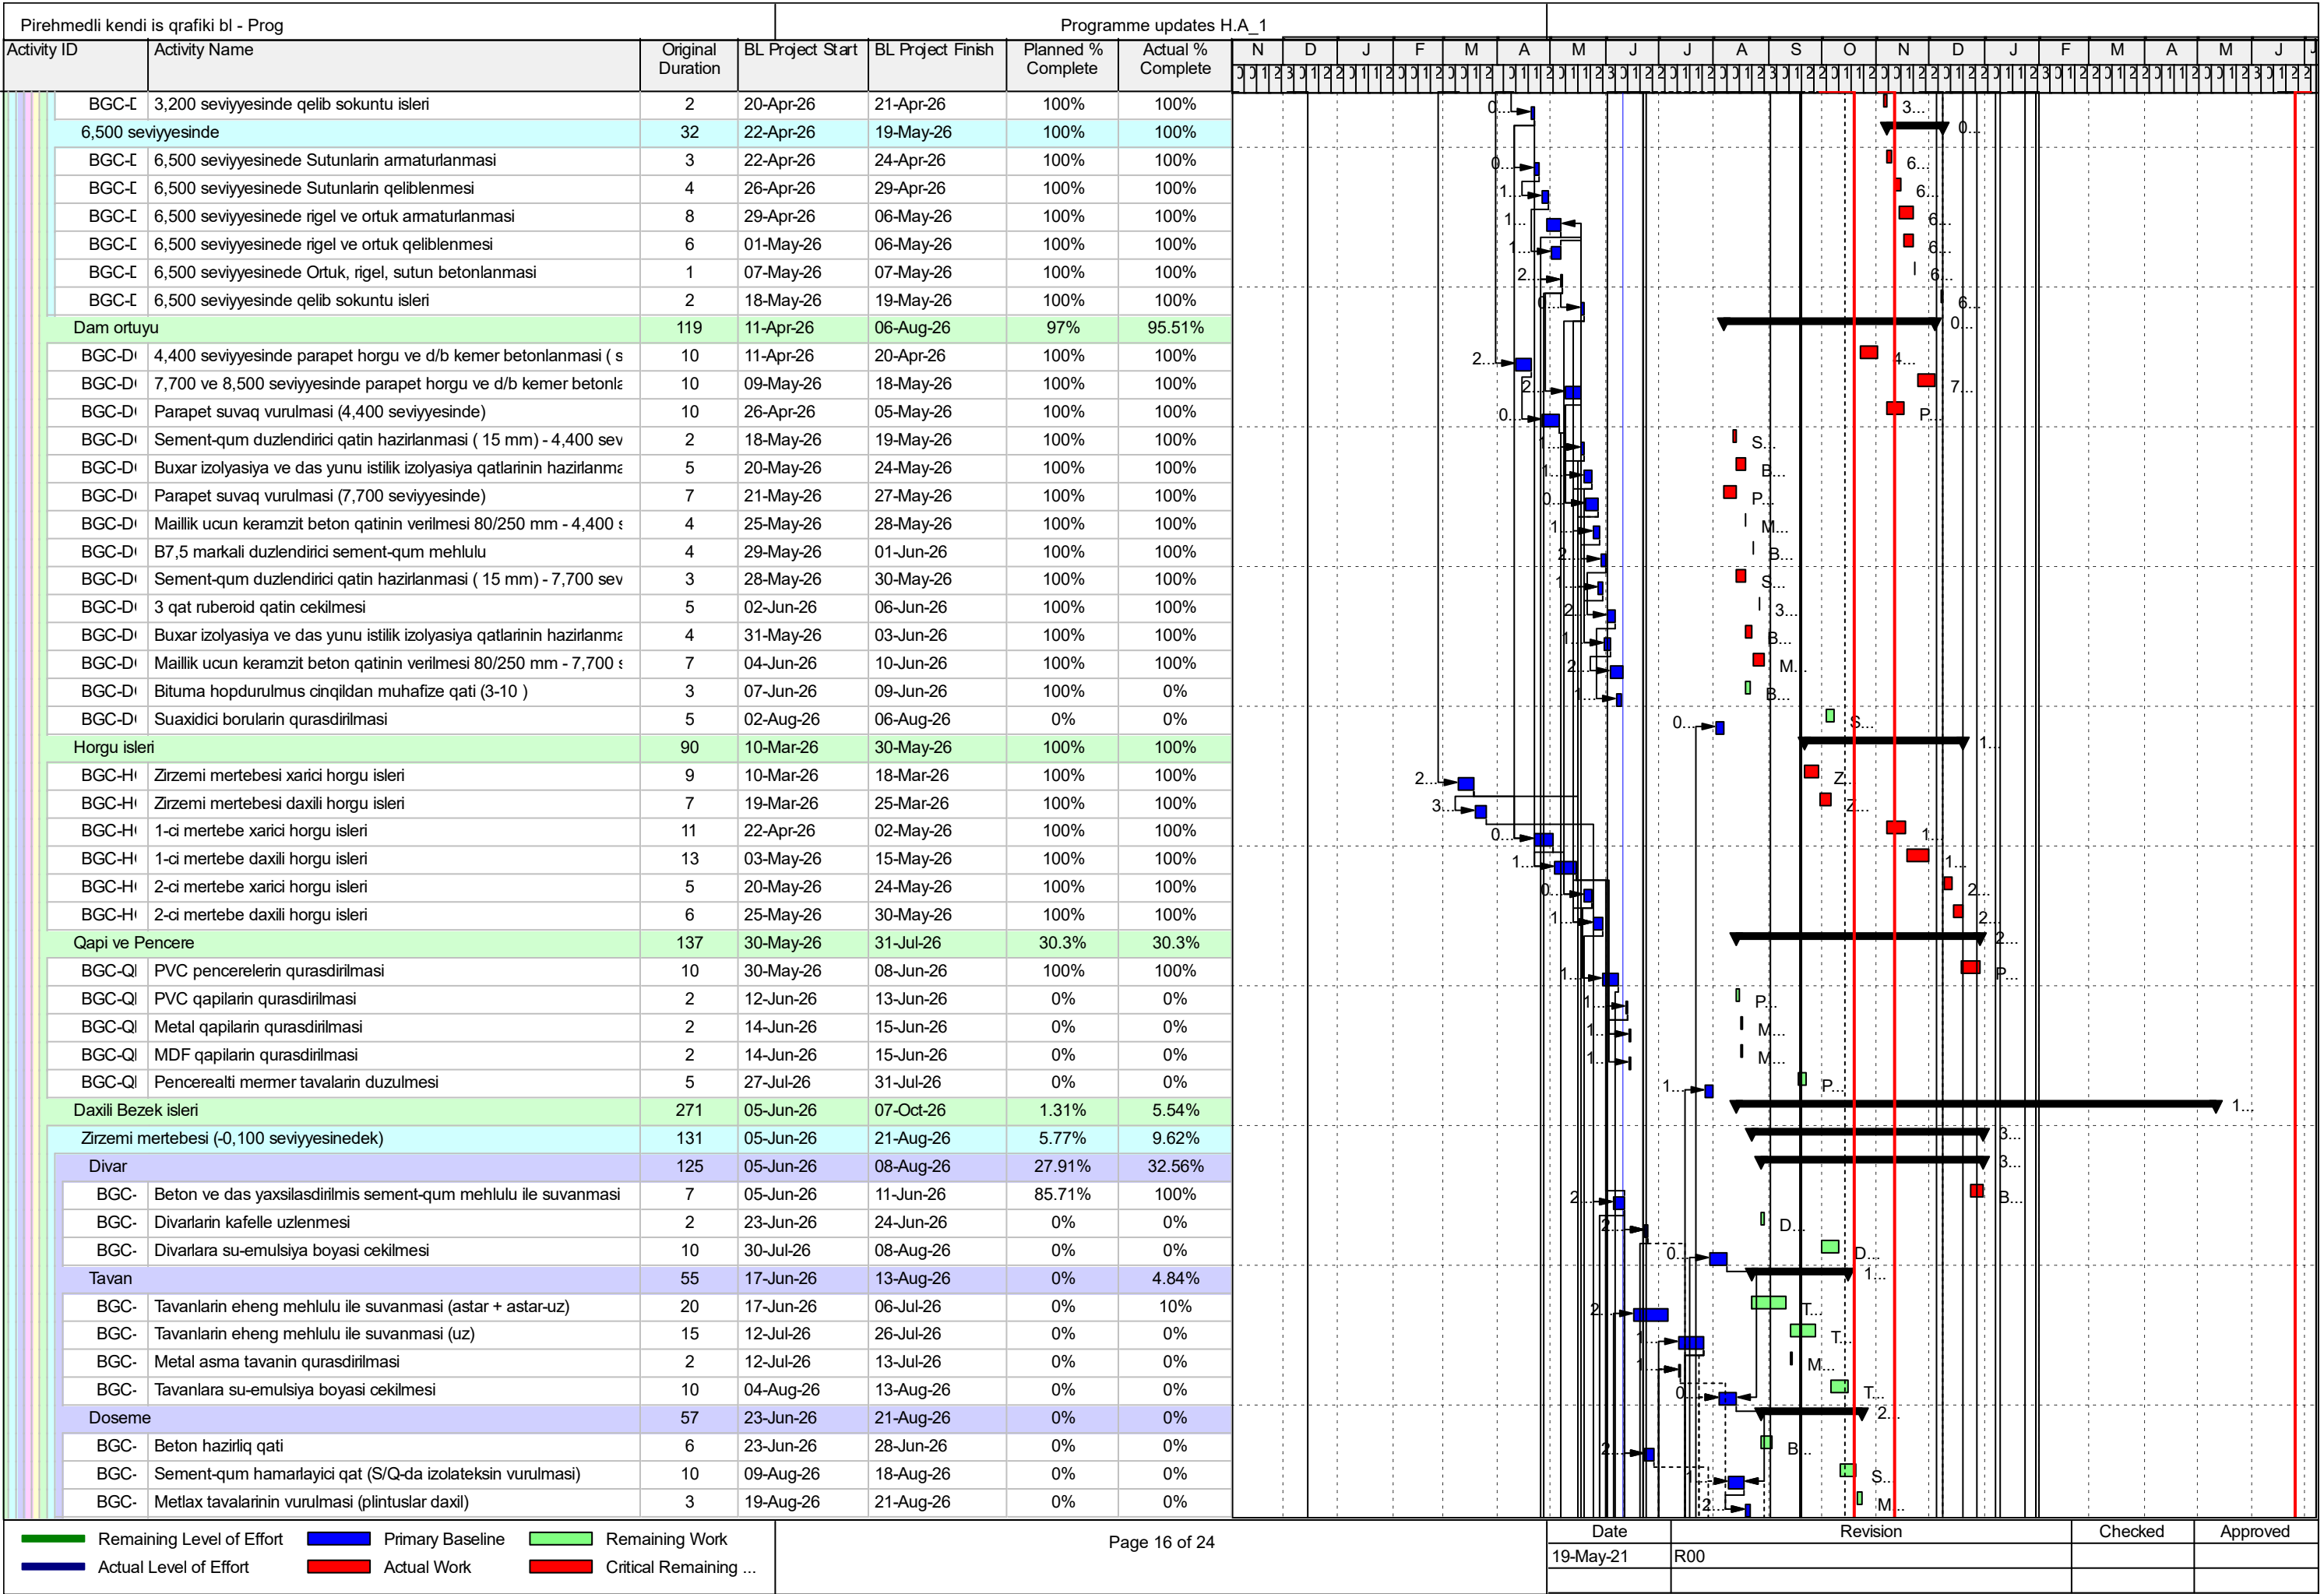

Pirehedmedli kendi is grafiki bl - Prog							Programme updates H.A_1																											
Activity ID	Activity Name	Original Duration	BL Project Start	BL Project Finish	Planned % Complete	Actual % Complete	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J							
1-ci mertebe (3,200 seviyyesinedek)																																		
Divar		149	12-Jun-26	11-Sep-26	0%	13.56%																												
BGC-	Beton ve das yaxsilasdirilmis sement-qum mehlulu ile suvanmasi	10	12-Jun-26	21-Jun-26	0%	100%																												
BGC-	Divarlara yuksek keyfiyyetli Agdag suvagin vurulmasi	30	22-Jun-26	21-Jul-26	0%	0%																												
BGC-	Divarlarin kafelle uzlenmesi	15	02-Jul-26	16-Jul-26	0%	0%																												
BGC-	Sethlerin eheng mehlulu ile suvanmasi (astar + astar-uz)	20	07-Jul-26	26-Jul-26	0%	0%																												
BGC-	Sethlerin eheng mehlulu ile suvanmasi (uz)	15	27-Jul-26	10-Aug-26	0%	0%																												
BGC-	Divarlara su-emulsiya boyasi cekilmesi	10	02-Sep-26	11-Sep-26	0%	0%																												
Tavan		72	07-Jul-26	16-Sep-26	0%	0.98%																												
BGC-	Metal asma tavanin qurasdirilmasi	10	12-Jul-26	21-Jul-26	0%	5%																												
BGC-	Tavanlarin eheng mehlulu ile suvanmasi (astar + astar-uz)	25	07-Jul-26	31-Jul-26	0%	0%																												
BGC-	Tavanlarin eheng mehlulu ile suvanmasi (uz)	15	11-Aug-26	25-Aug-26	0%	0%																												
BGC-	Tavanlara su-emulsiya boyasi cekilmesi	15	02-Sep-26	16-Sep-26	0%	0%																												
Doseme		77	04-Jul-26	01-Oct-26	0%	0%																												
BGC-	Sement-qum hamarlayici qat (S/Q-da izolateksin vurulmasi)	6	04-Jul-26	09-Jul-26	0%	0%																												
BGC-	Laqalar oncesi ruberoid izolyasiya qati	20	08-Jul-26	27-Jul-26	0%	0%																												
BGC-	Metlax tavalarinin vurulmasi (plintuslar daxil)	20	10-Jul-26	29-Jul-26	0%	0%																												
BGC-	Agac laqalarin islenmesi (aralarinda ses izolyasiyasi qoyulmaqla)	20	10-Jul-26	29-Jul-26	0%	0%																												
BGC-	Taxta dosemenin vurulmasi	20	15-Jul-26	03-Aug-26	0%	0%																												
BGC-	MDF supurgeliklerin vurulmasi	6	04-Aug-26	09-Aug-26	0%	0%																												
BGC-	Dosemenin cilalanmasi ve renglenmesi	15	17-Sep-26	01-Oct-26	0%	0%																												
2-ci mertebe (6,500 seviyyesinedek)																																		
Divar		232	22-Jun-26	24-Sep-26	0%	9.78%																												
BGC-	Beton ve das yaxsilasdirilmis sement-qum mehlulu ile suvanmasi	6	22-Jun-26	27-Jun-26	0%	75%																												
BGC-	Divarlara yuksek keyfiyyetli Agdag suvagin vurulmasi	20	13-Jul-26	01-Aug-26	0%	0%																												
BGC-	Divarlarin kafelle uzlenmesi	8	17-Jul-26	24-Jul-26	0%	0%																												
BGC-	Sethlerin eheng mehlulu ile suvanmasi (astar + astar-uz)	10	02-Aug-26	11-Aug-26	0%	0%																												
BGC-	Sethlerin eheng mehlulu ile suvanmasi (uz)	10	12-Aug-26	21-Aug-26	0%	0%																												
BGC-	Divarlara su-emulsiya boyasi cekilmesi	8	17-Sep-26	24-Sep-26	0%	0%																												
Tavan		232	25-Jul-26	02-Oct-26	0%	1.28%																												
BGC-	Metal asma tavanin qurasdirilmasi	8	25-Jul-26	01-Aug-26	0%	5%																												
BGC-	Tavanlarin eheng mehlulu ile suvanmasi (astar + astar-uz)	15	02-Aug-26	16-Aug-26	0%	0%																												
BGC-	Tavanlarin eheng mehlulu ile suvanmasi (uz)	8	22-Aug-26	29-Aug-26	0%	0%																												
BGC-	Tavanlara su-emulsiya boyasi cekilmesi (S/Q-da neme qarshi su-er	8	25-Sep-26	02-Oct-26	0%	0%																												
Doseme		74	13-Jul-26	07-Oct-26	0%	0%																												
BGC-	Sement-qum hamarlayici qat (S/Q-da izolateksin vurulmasi)	5	13-Jul-26	17-Jul-26	0%	0%																												
BGC-	Metlax tavalarinin vurulmasi	7	02-Aug-26	08-Aug-26	0%	0%																												
BGC-	Agac laqalarin islenmesi (aralarinda ses izolyasiyasi qoyulmaqla)	8	04-Aug-26	11-Aug-26	0%	0%																												
BGC-	Laqalar oncesi ruberoid izolyasiya qati	8	04-Aug-26	11-Aug-26	0%	0%																												
BGC-	Taxta dosemenin vurulmasi	8	09-Aug-26	16-Aug-26	0%	0%																												
BGC-	MDF supurgeliklerin vurulmasi	5	17-Aug-26	21-Aug-26	0%	0%																												
BGC-	Dosemenin cilalanmasi ve renglenmesi	6	02-Oct-26	07-Oct-26	0%	0%																												
Pillekan qefesi																																		
BGC-I	Sement-qum qarisigi (pillekan qefesi)	30	17-Jun-26	16-Jul-26	0%	0%																												
BGC-I	Mermer dosemenin ve supurgeliklerin vurulmasi (pillekan qefesi)	30	19-Jun-26	18-Jul-26	0%	0%																												
BGC-I	Meheccerlerin qurasdirilmasi	5	30-Aug-26	03-Sep-26	0%	0%																												
Xarici Bezek isleri																																		
BGC-XI	Zirzemi mertebesi izolyasiya ve suvaq isleri	8	28-May-26	04-Jun-26	100%	100%																												
BGC-XI	Ayaqaltilarin qurasdirilmasi	5	13-Jun-26	17-Jun-26	0%	20%																												
BGC-XI	Xarici divarlarin suvanmasi	15	18-Jun-26	02-Jul-26	0%	10%																												
BGC-XI	Sethlerin uzerinden dekoratik uzluk ve boya vurulmasi	30	03-Jul-26	01-Aug-26	0%	0%																												

